

Señores

JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN
Ciudad

Ref.: Proceso verbal instaurado por HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. Contra
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.
RDO. # 2019 - 00381

ASUNTO: Respuesta a la demanda inicial dentro del llamamiento en
garantía.

GUILLERMO DE JESUS ORREGO PALACIO, abogado en ejercicio, portador de la T. P. # 35849 del C. S. de la Judicatura e identificado con la cédula de ciudadanía # 70119857 de Medellín, obrando en nombre y representación de la Sociedad DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S. A. S., sociedad con domicilio en la Ciudad de Medellín, con NIT # 830510086-2 representada por CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía # 71699089, por medio de este escrito doy respuesta a la demanda inicial atendiendo el llamamiento en garantía que dentro del proceso de la referencia realizó MUNDIAL DE SEGUROS S A. a la sociedad DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S..A.S. y manifiesto lo siguiente frente a los

HECHOS:

1.- El contrato entre el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE y DATANET: Es cierto.

2.- Elementos y sistemas contratados: No es cierto, El diseñador del hospital en lo que tiene que ver con los pliegos y la plantilla de cotización dio ese porcentaje ponderado a cada ítem relacionado en este hecho.

En lo tocante con los ítems; "Monitoreo de variables electromecánicas, en el cual se contemplaba el monitoreo de alrededor 8 sistemas con sus respectivos componentes, de marca Honeywell (el 5.1% del valor del contrato). y "La adecuación de dichas plataformas con los sistemas actuales de la Torre B (el 4.2% del valor del contrato), hay un error pues el número de sistemas incluidos dentro del alcance del contrato eran muy superior al enunciado en este hecho y además el porcentaje que allí aparece asignado a cada ítem no representa la realidad del contrato pues esta integración y adecuación se convierte en el cerebro de toda la implementación del contrato.

Para que esto se puede dar se debería tener toda la información de los sistemas, todos los equipos de cómputo para los sistemas del alcance del contrato y el respectivo centro de monitoreo donde se debían administrar

estos sistemas. El HOSPITAL PABLO TOBON URIBE incumple con la información, la infraestructura, la entrega de los servidores a tiempo, la entrega de los computadores de administración y el área locativa terminada del centro de monitoreo y prueba de ello es el correo electrónico con asunto "atraso BMS HPTU TA. 11.05.2017 y a esa fecha, aún no se había vencido el contrato.

En los pliegos de condiciones: "*Numeral 2.2*": *habla de que el contratista en este caso DATANET, no es responsable de la infraestructura de red IP (el contratista no suministra e instala los SWITCH, ni programa nada en los mismos), otros contratistas estaban obligados a entregar el punto a cero metros, garantizando el tráfico y buen desempeño en la red.* En este ítem también incumplió el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE, ya que no solo entregaron tardíamente los servidores, sino que la programación de las VLAN no estuvo a tiempo y DATANET encuentra fallas en campo donde las cámaras no llegaban al centro de monitoreo por programación de las VLAN en los SWITCH.

Y en el mencionado pliego, "*Numeral 2.5.3.2*": *Canalizaciones, tubería y cajas de paso: en caso de requerirse canalizaciones, tuberías y cajas de paso deben ser indicadas como rutas de cableado, pero la ejecución de estos trabajos sería parte del alcance de otro contratista.* En este punto también incumplió el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE ya que se venció el término del contrato y no tendieron tubería para cámaras de seguridad, electromecánicas tal como se colige de los correos anexos, correos enviados a HOSPITAL PABLO TOBON URIBE cuatro días antes de que se venciera el contrato.

3.- 4 - Valor del contrato, Forma de pago del precio: Así aparece dentro del texto del contrato,

5.- Plazo de ejecución: Así se acordó dentro del contrato, pero en lo que tiene que ver con la petición de ampliación del término del contrato a través de los otros ítems enunciados en este hecho, el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE hacía la petición verbalmente al contratista, DATANET, de que enviara una carta solicitando la prórroga.

En reunión sostenida en el departamento de mantenimiento del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE en la oficina del señor Oscar Saldarriaga con presencia de los señores Nelson Julián Vargas Escobar y Carlos Hernando Granda Arcila, representante legal de DATANET, antes de la firma del último OTRO SI firmado por las partes, se manifestó por parte de DATANET al HOSPITAL PABLO TOBON URIBE que al CONTRATISTA le preocupaba firmar otro SI pues la obra ya tenía un atraso de más de siete meses, retraso ocasionado por falta de adecuación de los centros técnicos tendido de infraestructura, ubicación de tomas de 110V, entrega de programación para programación de los sistemas y definición por parte del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE del personal interno para recibir los sistemas pues esta prórroga del término de ejecución del contrato, estaba generando grandes costos al CONTRATISTA en el mantenimiento del personal a cargo de la obra. De hecho este sobrecosto nunca se tiene en cuenta ni en la cotización ni dentro del contrato que celebran las partes puesto que cuando se hace el descuento otorgado al HOSPITAL PABLO TOBON URIBE antes de firmar el contrato, los señores OSCAR DARIO SALDARRIAGA Y OSCAR BOTERO de la administración

delegada manifestaron que el contrato no sufriría retrasos y las adecuaciones están listas para ejecutar el contrato dentro del plazo pactado, lo cual en la realidad no fue cierto.

6.- Acuerdo sobre costos de las prórrogas. No es cierto, en los textos de los OTROSIES no se pactó lo asegurado en este hecho.

7.- Solicitudes de DATANET (para nueva prórroga del plazo y adjudicación).

No es cierto, DATANET no solicitó en forma unilateral la ampliación del plazo del contrato, esto siempre se hace de común acuerdo entre las partes pues la infraestructura de la obra de la torre A que le correspondía al HPTU, a esa fecha aún no estaba terminada. De otro lado no es cierto lo asegurado en este hecho de que DATANET solicita adjudicación del contrato de mantenimiento para los equipos de la torre B., lo que solicitó fue la prórroga de un contrato que el CONTRATISTA (DATANET), venía ejecutando.

En el soporte enviado como consta en junio 12 de 2017 con radicado C-2017-00029955, se solicita la prórroga pero con un detalle muy claro y es en el cual se evidencian los incumplimientos reiterados por parte del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE, tal como consta en el escrito, ya que dentro del contrato firmado por DATANET no contemplaba el tendido de la infraestructura para los sistemas electromecánicos, cámaras etc. La citada infraestructura correspondía a la obra y esta la debía tener adecuada el contratante, tal como consta en el contrato.

8.- Respuesta del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE a DATANET: Efectivamente se recibió respuesta del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE.

9.- Reacción de DATANET a la respuesta del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE.

No es cierto, DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. decide permanecer en las instalaciones del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE buscando la liquidación del contrato o la firma de otro Si donde se reconociera el valor que generaría la ampliación del contrato pues los retrasos no eran imputables a DATANET tal como se puede colegir de los correos enviados por la demandada en reconvención

El abandono de la ejecución y el incumplimiento de DATANET

10. DATANET incumplió y abandonó la ejecución del contrato. No es cierto y prueba de ello se encuentra en documento radicado en el HPTU con numero c- 2017-00033609 cuyo asunto es: Incumplimiento pactos realizados entrega proyecto automatización TORRE A HPTU. Este documento nunca obtuvo respuesta por parte del HPTU y la reacción en enero de 2018 fue prohibir la entrada del personal de DATANET a las instalaciones del contratante.

- (i) No es cierto, las obras pendientes por terminar dependían todas de la ejecución del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE tal como consta en varios correos electrónicos cruzados entre las partes y varias actas como la # 2017-15 de Julio 5 de 2017 formato y papelería del contratante, en el ítem de seguimiento de tareas numeral 3 Wilfer Zuluaga (HOSPITAL PABLO TOBON URIBE) no había entregado la base de datos para el control de acceso; numeral 5 WILFER ZULUAGA Y JULIAN ZAPATA (HOSPITAL PABLO TOBON URIBE) no habían presupuestado el tendido de los puntos de datos para las

variables electromecánicas que se debían llevar y programar al DMS; numeral 6, WILFER ZULUAGA (HOSPITAL PABLO TOBON URIBE) debía recibir el control de acceso, cámaras e incendio en TORRE A. Con esto se demuestra que solo hasta el 5 de julio de 2017 es decir 19 días después de vencido el contrato el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE designó una persona para recibir los sistemas que ya estaban instalados y funcionando, numeral 13, WILFER ZULUAGA y OSCAR SALDARRIAGA (HOSPITAL PABLO TOBON URIBE) debían enviar a DATANET la información y el protocolo por parte de accequip para el mapeo y configuración de variables de la bomba de incendio. Es decir 19 días después de vencido el contrato no se había enviado por parte del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE las variables e información para integrar al BMS. Aclaro: El BMS es la integración de todas las tecnologías tales como incendio, acceso, cámaras, subestaciones, electromecánicos etc., en un sistema central que permita la administración y actuación amigable sobre estos sistemas.

(ii) No es cierto: Cuando se habla del 15 junio de 2017, donde se especifica que Datanet tenía pendientes contractuales, no sabemos a qué se refiere la parte demandante, ya que a esta fecha el contratante no había fijado el personal que recibiría los sistemas en campo, adicionalmente el contratante tenía pendiente envío de información de programación de los sistemas y tenía pendientes el tendido de infraestructura para sistemas electromecánicos que apenas estaba gestionando. En correo enviado por DATANET el día 13 de mayo de 2018 a las 8:36 am a los señores Oscar Saldarriaga y Oscar botero de la administración delegada, se les mencionaba los faltantes imputables al HOSPITAL PABLO TOBON URIBE, haremos un breve recuento de estos:

- Configuración de usuarios y tarjetas software prowatch de acceso, pendiente del contratante por un proceso de carnetización ajeno a nuestro contrato, se venció el plazo y el contratante no entrego la información.
- Configuración de perfiles de acceso y horarios, pendiente del contratante por un proceso de carnetización ajeno al contrato, se venció el plazo y el contratante no entrego la información.
- Reconfiguración de 234 cámaras, el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE envió una programación para estas cámaras y después la cambio por un error interno de los funcionarios del contratante, hecho imputable al contratante y retrasos causados al proyecto. Datanet le toco asumir la reconfiguración de esas cámaras sin ningún costo para HOSPITAL PABLO TOBON URIBE.
- Configuración de señales de iluminación, plantas de emergencia, tableros de aislamiento, tableros eléctricos, sistemas de bombeo toda esta información debía enviarse por parte del contratante-demandante y no se envió, por lo tanto, no se puede asegurar que DATANET tenía pendientes contractuales.
- El atraso en la entrega del edificio técnico por parte del contratante, sitio donde va todo el centro de monitoreo, sitio

donde llegan todas las señales de los sistemas contratados, ocasionaron problemas en la instalación de monitores, mueble de operación, instalación de paneles remotos de incendio.

- Falta de tendido de infraestructura para las torres de bombas, actividad de responsabilidad del contratante.

- (iii) No es cierto. Cuando el demandante dice que recibió equipos empacados para remediar el incumplimiento falta a la verdad, puesto que antes de iniciar el proyecto los señores Oscar Saldarriaga del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE y Oscar Botero de la administración delegada informaron que el demandante no dispondría de todo el dinero por el cual se había ofertado el sistema de automatización, que se debía depurar las cantidades y el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE designó al señor Edison Vélez para atender las reuniones de depuración de cantidades, fue un trabajo continuo de un mes y al final el mismo Edison Vélez pasó el informe a los señores mencionados, dándole las cantidades con las cuales se haría el contrato, se pactó con los señores Saldarriaga y Botero las cantidades y si por algún motivo sobraban equipos y elementos, el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE los recibiría en calidad de suministro, fue un pacto adquirido. Adicionalmente el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE incumplió y se retractó en los pactos realizados como consta en las pruebas que se solicitaran, donde fijan una fecha para recibir los equipos excedentes y no los recibieron, haciendo incurrir en extra costos al demandado en reconvencción ya que posteriormente reciben los equipos, pero no los pagaron.
- (iv) No es cierto. DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. propone un cronograma en correo enviado el 22 de agosto de 2017 a las 5:05 pm al señor OSCAR SALDARRIAGA (HOSPITAL PABLO TOBON URIBE) propuesto para redactar el supuesto OTRO SI. Se le informa al funcionario del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE que tenga en cuenta las observaciones en el archivo anexo y en la observación numeral 6 Datanet "realiza claridad de que la ejecución del presente cronograma está sujeto a la firma del otrosí. Sin la firma del otrosí, Datanet no iniciará con la ejecución de las actividades descritas en el cronograma"
- (v) No es cierto, en el acta 637 radicada en el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE # C-2017-00033261 se entrega documentación del sistema pactado del CCTV donde se informa que se entrega un DVD con la siguiente documentación: tabla en Excel con el listado de cámaras entregadas en el sistema, informe de la entrega del sistema, evidencia de las capacitaciones realizadas por DATANET al personal operativo del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. A estas capacitaciones no asiste ningún miembro del departamento técnico del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE, cuando se citaron a más de 10 personas y solo asistieron dos vigilantes de la parte demandante, HPTU. (prueba 6 anexada con la respuesta a la demanda de reconvencción).
- (vi) No es cierto y aclaro: Lo que se tenía que hacer por parte del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE era liquidar el contrato que se había vencido desde el 17 de junio de 2017. La entrega de los equipos era una consecuencia de esa liquidación, entrega de equipos que solo funcionarían si el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE hubiese tenido la infraestructura suficiente para que ello ocurriera. En acuerdo

verbal realizado con el Dr. Luis Guillermo Saldarriaga y en presencia de los señores OSCAR DARIO SALDARRIAGA y NELSON JULIAN VARGAS ESCOBAR, en documento radicado en el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE bajo el # 2017-000-33609 de diciembre 19 de 2017 se informa que el que incumple los pactos realizados fue el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE puesto que como dice en ese comunicado DATANET se encontraba entregando los sistemas tal como se hallaban a la fecha de entrega y que de esta forma se hacía un acta de entrega, se firmaba por los intervinientes, se pasaba una factura proporcional a la entrega y el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE la pagaba a los tres días, Esto nunca se cumplió por este último y al citado documento enviado por DATANET nunca se le dio respuesta y la posición del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE para la primera semana de enero fue negar la entrada del personal de DATANET a las instalaciones del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE y negar igualmente el pago de unas facturas emitidas por DATANET. Ante este nuevo incumplimiento DATANET decide recurrir a la Cámara de Comercio para lograr una conciliación con el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE a lo que este último responde igualmente convocando a DATANET a una conciliación en la Cámara de comercio de Medellín y buscando una conciliación con el fabricante de los equipos, HONEYWELL. En esta conciliación en Cámara de Comercio DATANET ofreció realizar una reunión en las instalaciones del HPTU donde manifestó que estaban dispuesto a demostrar que los equipos estaban funcionando y las licencias se encontraban en operación; el conciliador planteó una semana para que el HPTU decidiera sobre esta propuesta y nunca se dio respuesta positiva.

- (vii) No es cierto y ello demuestra que efectivamente DATANET mantuvo su personal en las instalaciones de HOSPITAL PABLO TOBON URIBE para atender contingencias y en espera de la liquidación definitiva del contrato.
- (viii) En respuesta a este hecho acalro que terceras personas para esa fecha venían manipulando los equipos instalados y en correo fechado el 14 de diciembre de 2017 a las 9:45 a. m. el ingeniero Milton Marulanda de DATANET, envía un correo al señor OSCAR SADARRIAGA con copia a Edison Andrés Velez Ramirez del HPTU y en el cual se informa claramente que personal del HPTU y la empresa externa EXPERTOS ya venían manipulando los password de las cámaras y sistema de CCTV.
- (ix) No es cierto, es imposible que DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONSS S.A.S. abandone la ejecución. La ejecución del contrato no se abandona por parte de DATANET pues el término para la ejecución del mismo ya se había vencido desde el 16 de junio de 2017. En lo tocante con este contrato de suministro e instalación de equipos el termino pactado para su ejecución venció el 16 de junio de 2017 y si las partes no acuerdan su prorrogación tendría que procederse a la liquidación del mismo y el HPTU nunca accedió a liquidar el contrato causando enormes perjuicios a DATANET. Quiero reiterar que el término de ejecución del contrato para el mes de diciembre de 2017 ya estaba vencido y las partes nunca lo prorrogaron por lo cual jamás se puede aceptar que señalen a DATANET como la empresa que abandonó o dejó tirada la ejecución del contrato. La realidad es que el HPTU nunca

cumplió con sus obligaciones técnicas lo que termina generando el vencimiento del contrato, obligaciones reitero, que debe cumplir el HPTU y que constan en correos enviados desde agosto 4 de 2015.

Los trámites del HPTU para remediar el incumplimiento de DATANET

11. No me consta, que lo pruebe la parte demandante sin embargo preciso que en acta del 5 de julio de 2017, ya vencido el contrato, en el numeral 6 "tareas realizadas" se deja claro que DATANET instaló las licencias en los servidores del BMS el 10 de abril del mismo año, servidores que debía instalar el HPTU conforme las obligaciones contraídas con la firma del contrato.

12.- No me consta, que lo pruebe la parte demandante.

13.- No es cierto y aclaro: Las claves y usuarios fueron entregadas al HPTU tal como consta en las actas, dando cumplimiento a lo pactado dentro del contrato. **Ahora bien, ni la interventoría ni la administración delegada informaron o enviaron documentación a DATANET solicitando la entrega de las claves y usuarios. Era obvio, ya habían sido entregadas tal como consta cd entregado al HOSPITAL PABLO TOBON URIBE.**

14.- Es parcialmente cierto sin embargo con respecto al segundo inciso de este hecho, no es cierto lo allí expresado pues DATANET entregó toda la información necesaria para acceder a los sistemas pero aclaro que el personal que había designado el HPTU para la administración y programación de los sistemas y que debió acudir a la capacitación para el manejo y programación de los sistemas, el día 22 de junio de 2017 y 23 de noviembre de 2017, solo se redujo a dos personas y ninguno del Departamento técnico del HPTU, lo que prueba una vez mas que no existía ni gestión ni interés de parte del personal técnico del HPTU para que se cumpliera el objeto del contrato.

15.- No me consta, que lo pruebe la parte demandante.

16.- No me consta, que lo pruebe.

17.- No me consta que lo pruebe, sin embargo, quiero llamar la atención sobre este hecho en el sentido de que no se puede pretender un diagnóstico sobre unos equipos instalados desde junio de 2017, 18 meses después, equipos que requieren un mantenimiento pero que el HPTU nunca lo hizo además de que esos equipos gozan de una garantía de un año y obviamente esa garantía ya se había vencido.

17.1 En relación con el control de Acceso.

(i) **Múltiples tarjetas de acceso apagadas:** No le consta a DATANET, sin embargo es necesario aclarar que cuando se retira DATANET de las instalaciones del HPTU todos los equipos instalados por el llamado en garantía se encontraban en funcionamiento. El diagnóstico de la compañía contratada por el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE, se hace 18 meses después de finalizado el contrato. En el comunicado enviado por el departamento jurídico de DATANET el 4 de enero de 2018 se deja constancia que estos sistemas fueron recibidos y que el

mantenimiento de los mismos estaba supeditado a petición del HPTU y aprobación de una cotización que enviaría DATANET a lo cual el HPTU nunca dio respuesta.

(ii) Gran variedad de equipos pendientes por instalar; (iii) El 7.3% de las puertas instaladas carecen de "lectoras"; (iv) Falta por reconocer el 7.14% de las conexiones y falta mejorar la instalación y marcación de los gabinetes; (v) la conexión de la estación de trabajo de software prowatch arroja errores de autenticación (vi) se instaló menor cantidad de equipos que las enumeradas en el contrato. No me consta y aclaro: el contrato tenía como partes intervinientes un administrador delegado, la firma ARQUITECTURA Y CONCRETO; interventoría, la firma INTERVE; una directora; ELIZABETH TORO, del HPTU; una dirección de ingeniería, OSCAR SALDARRIAGA del HPTU y un procedimiento que se debía seguir: La administración delegada pasaba la programación de los Trabajos a realizar, INTERVE verificaba los trabajos realizados y permitía la elaboración del corte de obra. Este corte de obra se regresaba al administrador delegado e interventoría y después se autorizaba la facturación por parte de estos. Si faltaren elementos o equipos o dispositivos por instalar, o los mismos no tuviesen la marcación requerida o existiese errores de autenticación o se hubiese instalado menos equipos de los pactados, debió en su momento hacerse saber a DATANET a través de un comunicado o hacerse un llamado de atención a DATANET por la administración delegada o la interventoría y este hecho nunca ocurrió. Durante todo el tiempo de ejecución del contrato DATANET jamás recibió llamados de atención o multas por incumplimiento en la ejecución del mismo. No puede pretender la parte demandante en reconvención, 18 meses después, llamar la atención de unos faltantes que nunca ocurrieron y que reitero, jamás se hicieron saber por parte del HPTU.

17.2 En relación con el sistema de detención de Incendio; 17.3 En relación con el sub-sistema de Intrusión; 17.4 En relación con el sub-sistema de circuito cerrado de televisión; 17.5 en relación con el sub-sistema de electromecánicos. No le consta a datanet todo lo allí expresado por la empresa G4S y aclaro: No puede pretender el demandante hacer responsable a DATANET de los faltantes que aparecen en equipos y sistemas instalados 18 meses después de vencido el término de ejecución del contrato. Los equipos jamás debieron ser intervenidos por un tercero sin contar con la empresa que los había instalado. Existen pruebas claras de intervención de terceros en el manejo y manipulación de los equipos como el video donde se observa la intervención de los equipos por parte del personal del HPTU y un proveedor del HPTU desmontando un dispositivo del sistema del control de acceso sin autorización previa de DATANET. Lo grave del suceso es que todavía DATANET COLOMBIA se encontraba en las instalaciones del HPTU. Se puede observar en el video la fecha de la ocurrencia del hecho. Otra prueba más de la intervención de terceros no autorizados y avalados por el HPTU se presentó cuando el 26 de octubre de 2017 reportan una falla en una lectora (significa que estaba en funcionamiento), piso 2 eje 13, con número de ticket 9536 y al asistir DATANET a las instalaciones del HPTU para verificar la falla anunciada en compañía de un funcionario del HPTU, se observó que la lectora fue manipulada por personal externo

de DATANET ya que la misma tenía el tornillo principal diferente al de fábrica, lo cual alteró la garantía del equipo. Este hecho se dio a conocer al HPTU en correo enviado el 3º de octubre de 2017, cuando ya se había vencido el contrato.

Una prueba más de la irresponsable manejo de los equipos instalados por DATANET al interior del HPTU se evidencio el 24 de junio de 2017 cuando se encontró la NVR # 12 instalada en el cuarto de TI del edificio técnico, desconectada de su alimentador de energía. Se procedió por parte de DATANET a la conexión del equipo y verificación de su funcionamiento y se constató que las cámaras presentaban grabación hasta el 21 de junio de 2017 a las 11 p m (significa que estaba en funcionamiento). Se concluye que fue esta la hora en que se desconectó el equipo y a esa hora solo operaba en las instalaciones el personal del HPTU. De este hecho se envió correo al HPTU y nunca se obtuvo respuesta efectiva.

No se puede pretender realizar un diagnóstico a un sistema de automatización, unos equipos y suministros sin saber quién o quienes durante 18 meses los manipularon e intervinieron generado la perdida de garantía de los mismos.

18.1 a 18.6. La cotización de G4S para terminar la ejecución del proyecto.

No me consta y deberá ser probado por el HPTU. Aclaro: el contrato con DATANET termino el 16 de junio de 2017 y debió ser liquidado por el HPTU. Lo que pretenda invertir en equipos y sistemas el HPTU posterior a esa fecha de finalización del contrato será bajo su responsabilidad y no tiene nada que ver con DATANET.

18.7 Cotización para cambio de elementos con fallas del sistema de detección de Incendio. Este hecho no le consta al demandado DATANET COLOMBIA sin embargo aclaro: Todos los equipos instalados por DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. tenían una garantía de doce meses que incluye defectos de fabricación, garantía que se hace exigible solo si los equipos no fueron intervenidos por terceras personas diferentes a DATANET.

El demandante en reconvención, HPTU nunca hizo reclamación a DATANET por defectos en la fabricación de los equipos Y el tiempo de vigencia de la garantía ya estaba vencido para la fecha de cotización por parte de la compañía G4S.

18.8 Cotización para integración con sistema de perifoneo.

Este hecho no le consta al demandado sin embargo aclaro: el sistema de perifoneo hacia parte de la información de integración que debía entregar el HPTU antes de vencerse el contrato.

18.8, 18.9, 18.10, 18.11. No le consta a la compañía llamada en gerantia

19. El HPTU aceptó la propuesta de G4S para la ejecución de lo no ejecutado por DATANET. No me consta y deberá probarlo la parte demandante sin embargo aclaro. El termino de vencimiento del contrato fue el 16 de junio de 2017 y a partir de ese momento las partes deben dirigir sus esfuerzos a la liquidación del mismo. Al HPTU se le hizo la solicitud de liquidación del contrato en varias ocasiones y hasta la fecha no lo ha hecho.

La póliza de seguros de cumplimiento de Mundial de Seguros

20. Este hecho está documentado en la demanda, por la parte demandante.

La demanda de DATANET contra el HPTU y la demanda de reconversión del HPTU contra Datanet (Juzgado 5°. Civil del Circuito).

21. **La demanda de Datanet contra HPTU.** Es cierto que Datanet Colombia Network Solutions s. a. s. presentó demanda contra el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE y la misma se tramita ante el Juzgado 5°. Civil del circuito de Medellín, por el incumplimiento del contrato de obra civil, celebrado en agosto de 2015. A la fecha el Juzgado no ha recibido el traslado a la respuesta de la demanda y no conoce la respuesta del HPTU.

22. **La demanda de reconversión del HPTU contra Datanet.** Es cierto, en el proceso judicial que cursa contra HPTU en el Juzgado 5°. Civil del circuito de Medellín, se presentó demanda de reconversión contra Datanet.

23. **La demanda de reconversión contra la aseguradora y su rechazo.** Es cierto.

Los perjuicios sufridos por el HPTU amparados por la póliza de Mundial de Seguros.

24., 24.1, 24.2. Al llamado en garantía no le constan los perjuicios allí enunciados.

24.3. No es un hecho.

PRETENSIONES:

En nombre de DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S. A. S. me opongo a que se hagan las declaraciones solicitadas por la parte demandante y se condene a pagar a la compañía Mundial de seguros s. a. los valores allí establecidos pues quien incumplió el contrato civil de obra origen de este proceso fue el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. Para tal efecto propongo las siguientes

EXCEPCIONES PREVIAS

1. Vencimiento del contrato y obligación de liquidación del mismo.

El HPTU dejó vencer el contrato desde el 16 de junio de 2017 y nunca aceptó la liquidación del mismo como debió ser el procedimiento a seguir luego del vencimiento del contrato.

Igualmente, DATANET cumple con sus obligaciones y pone en funcionamiento los equipos y sistemas, entrega claves, usuarios y capacita al personal que el mismo HPTU envía para tal fin, a las capacitaciones programadas por DATANET.

La legislación colombiana y la lógica jurídica enseña que una de las formas de terminación del contrato es el vencimiento del mismo por la llegada de la fecha pactada por los contratantes, para tal fin. Si ello ocurre las partes deben entrar a definir la forma de liquidación del contrato o la prórroga del plazo de ser necesario y el HPTU no atendió las solicitudes de DATANET Y no asumió ninguna de las variables que permitían prorrogar el contrato.

Las obligaciones imputables a DATANET fueron cumplidas por esta durante la ejecución del contrato y prueba de ella es que los equipos y sistemas instalados a la fecha de vencimiento del contrato se encontraban en funcionamiento tal como se demuestra con los documentos y correos adjuntados como prueba.

2. Nadie puede beneficiarse de su propia culpa (torpeza).

El HPTU dejó vencer el contrato celebrado con DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S y nunca facilitó la prórroga de la fecha de vencimiento por la cual la única alternativa del llamado en garantía era liquidar el contrato tal como se había ejecutado hasta la fecha de su vencimiento. No puede el HPTU pretender cobrar unos dineros a DATANET argumentando incumplimiento del contrato cuando lo que se presenta en este asunto es la terminación del contrato y consecuentemente debe liquidarse el mismo.

De otro lado fue reiterativo el incumplimiento del HPTU a las obligaciones que tenía contraídas con la firma del contrato. Jamás estuvo disponible la infraestructura necesaria para el cabal cumplimiento de las obligaciones por parte de DATANET a pesar de insistentes llamados de atención sobre este tema que cada día se le hacía al HPTU por parte del llamado en garantía, Datamet.

3. Cobro de lo no debido.

Pretende el HPTU el pago de unas sumas de dinero que se causan con posterioridad al vencimiento del contrato. Es de aclarar que las sumas pretendidas por el HPTU serían las que resulten probadas, en la eventualidad de que se presente un incumplimiento de contrato, pero lo que ocurre en este asunto es que el contrato termina por vencimiento de término y el HPTU solo tiene la alternativa de liquidar el mismo a la fecha de vencimiento.

4. Vencimiento de garantía de equipos instalados y manipulación de terceros.

Los equipos instalados por DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S tenía una garantía de un año por errores o fallas de fabricación y los mismos fueron instalados hace más de dos años de la fecha de presentación de la demanda referenciada y mal hace el HPTU en pedir el reconocimiento de unos equipos cuya garantía venció hace más de un año.

De otro lado, los sistemas fueron intervenidos por terceros de los cuales se desconoce su idoneidad, conocimiento y pericia en el manejo de los mismos y esa intervención de terceros acarrea la pérdida de cualquier garantía sobre los mismos pues terminaríamos desconociendo cuales el origen de la falla, si de quien los instala, o de quien interviene los equipos. El HPTU no atendió las instrucciones frente a la manipulación de terceros de los sistemas y equipos instalados y terminarían afectando los unos y los otros por la INTERVENCIÓN de terceros ajenos al contrato.

5. Temeridad y mala fe.

El artículo 79 del Código General del Proceso establece que: "Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

1.- Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recursos, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

2.- Cuando se reduzcan calidades inexistentes.

- 3.- Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente legales o con propósitos dolosos o fraudulentos.
- 4.- Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.
- 5.- Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.
- 6.- Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.

La presente demanda contra la Compañía Mundial de Seguros S. A. carece de fundamentos facticos y legales pues se está basando en el argumento de la existencia de un incumplimiento de contrato que no es atribuible al llamado en garantía cuando lo que realmente ocurrió en la relación contractual entre demandante y demandada es que el contrato que la soporta, venció desde el 16 de Junio de 2017, fecha en la cual debió procederse con su liquidación.

Es de advertir que mientras duró la ejecución del contrato nunca se hizo un llamado de atención a Datanet, por incumplimiento o defectos en los sistemas o equipos instalados.

El fundamento de la presente demanda contiene hechos que son contrarios a la realidad.

La interventoría no aparece durante la ejecución del contrato para alegar incumplimiento del mismo a pesar de que la cláusula NOVENA del contrato así lo autoriza... " LA INTERVENTORÍA, sus auxiliares y ayudantes tendrán libre acceso, en todo tiempo, a la Obra cuya ejecución ha sido encomendada al CONTRATISTA".

¿Ahora bien, acaso la figura de la Administración delegada era un invitado de piedra dentro del contrato? Dice el Consejo del Estado "De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administración delegada entre particulares o entre estos y entidades públicas, entraña la relación contractual propia del mandato, pues, a través de aquél, una persona confía la gestión de uno más negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera", y, en ejercicio del mismo, el mandatario puede contratar en su propio nombre o en el demandante, pero si contrata en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros (Código Civil, artículo 2142 y 2177).

Si se detectó un incumplimiento del contrato celebrado entre el HPTU y DATANET porque solo hoy se pretende reclamar por parte del HPTU. ¿Acaso HPTU no confió la gestión de este contrato a ARQUITECTURA Y CONCRETO? ¿Y porque esta administración delegada nunca durante el tiempo que se ejecutaba el contrato, realizó reclamaciones por incumplimiento a la contratista DATANET?

JURAMENTO ESTIMATORIO

Presento objeción al juramento estimatorio presentado por el HOSPITAL PABLO TOBON URIBE pues el mismo carece de fundamentos facticos y jurídicos que demuestren la realidad contractual generada por la ejecución del contrato de obra celebrado entre DATANET COLOMBIA NETQOIRK SOLUTIONS S.A.S. y HOSPITAL PABLO TOBON URIBE.

Las cifras presentadas con el juramento estimatorio no son reales y quien sufrió perjuicios en la ejecución del contrato, perjuicios generados por el incumplimiento del CONTRATANTE, Hospital Pablo Tobón Uribe, fue el CONTRATISTA, Dataanet Colombia Network Solutions s. a. s.

Tal como se narra en los hechos y la respuesta de esta demanda iniciada por el HPTU contra la compañía Mundial de Seguros s. a. existe un proceso verbal de mayor cuantía en el cual la llamada en Garantía Datanet Colombia Network Solutions s. a. s. demandó a la entidad HOSPITAL PABLO TOBON URIBE de Medellín por el pago de los perjuicios causados por el incumplimiento de sus obligaciones en la ejecución del contrato de obra civil de "SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO (sic), PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO, proceso que se tramita ante el Juzgado 5o. Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, bajo el radicado # 05001310300520180054100

DATANET COLOMBIA NETWORKS SOLUTIONS S.A.S no debe las sumas estipuladas por la demandante por concepto de incumplimiento del contrato celebrado entre ellos y la suma estipulada como adeudada por DATANET se calcula sobre el supuesto de un incumplimiento de contrato que nunca se dio por la parte de la llamada en garantía

PRUEBAS

Adjunto vía correo electrónico a la presente respuesta los siguientes medios de prueba:

- Correo solicitando infraestructura por parte del HPTU, necesaria para cumplimiento de obligaciones de Datanet, fechado el 2 de febrero de 2017
- Correo insistiendo en infraestructura obligación del HPTU, fechado el 23 de mayo de 2017.
- Correo del 13 de septiembre de 2017 que demuestra que DATANET continuaba en las instalaciones del HPTU y nunca abandonó sus obligaciones.
- Correos del 1.06.2017 que demuestran que HPTU no tenía lista la infraestructura para la fecha de terminación del plazo para ejecución del contrato de obra.
- Correo del 5.05.2017, faltan obras de infraestructura a cargo del HPTU.
- Correo 16.06.2017 Que demuestra falta de infraestructura a cargo del HPTU.
- Correo pendientes infraestructura del 29.06.2017 enviado a Datanet por el HPTU. Se demuestra que Datanet no se había retirado de las instalaciones del HPTU.
- Correo 14.09.2017. Se demuestra que Datanet aun permanecía en las instalaciones del HPTU y el incumplimiento de las obligaciones del HPTU.
- Corre 23.10.2017 que contiene orden de trabajo (OT) que demuestra la permanencia de Datanet en el HPTU.
- Correo 16.08.2017. Con el fin de recibir y entregar los sistemas al HPTU.
- Correo del 14.08.2017, prueba de permanencia de Datanet en el HPTU.
- Correo del 12.04.2017 que demuestra que no esta lista la infraestructura a cargo del HPTU.
- Correo de verificación CCTV. Demuestra que el HPTU a diciembre de 2017 aun no tenia la infraestructura lista y además demuestra la permanencia de Datanet en la obra.
- Correo liquidación contrato del 13.12.2017.
- Acta # 2017-15 del 5 de julio de 2017 donde se prueba que Datanet no abandono la obra y siguió ejecutando trabajos a pesar de que el

termino del contrato se había vencido, buscando la liquidación definitiva del mismo.

- Correo del 26.07.2017 que contiene tabla para entrega de suministros por parte de Datanet al HPTU
- Correo del 24.08.2017 anunciando la entrega de equipos al HPTU.
- Correo del 26.07.2017 "Entrega de suministros cableado estructurado CE027 nuevo incumplimiento del HPTU.
- Correos 26 y 30 de agosto de 2017, Entrega de equipos al HPTU.
- Comunicado de datanet dirigido al HPTU del 19 de diciembre de 2017 asunto: incumplimiento pactos realizados entrega proyecto automatización Torre A HPTU.
- Comunicación de Datanet del 10 de diciembre de 2017, dirigida al señor Oscar Saldarriaga radicada en el HPTU C-2017-0033631 en el cual se le informa que el sistema CCTV se encuentra funcionando en óptimas condiciones de configuración y funcionamiento.
- Correo del 14.14.2017, solución fallas CCTV.
- Correo del 13.12.2017 RV CCTV.
- ACTA 637 de Datanet, fecha noviembre 30 del 2017, ASUNTO: Entrega de documentación sistema CCTV Torre A.
- Correo 24.11.2017, en el que se adjunta corte acta 18 suministro automatización torre A.
- Correo de datanet, enviado el 5 de diciembre de 2017 asunto: Datanet Colombia: Entrega de subsistemas y facturación contrato CE028 Automatización torre A.
- Correo de HPTU, del 05.12.2017. asunto: respuesta correo anterior enviado por Datanet al HPTU.
- Correo 112.12.2017 de Oscar Saldarriaga HPTU dirigido al Datanet autorizando facturación y corte 18.
- Correo del 7.11.2017 de OSCAR SALDARRIAGA HPTU, donde aparece consignados algunos rubros pendientes por pagar.
- Correo del 12.05.2017 y acta del HPTU reunión con el fabricante de los equipos Honeywell.
- Acta entrega de suministros del 30.08.2017
- Fotos y videos que muestran la manipulación indebida de los equipos instalados por Datanet en el HPTU
- Acta de revisión proyectos de Datanet del 12.09.2017 donde se deja constancia de falas en infraestructura, mal utilización de los dispositivos o desmonte si aviso por parte del HPTU.

Testimoniales: Recibase testimonio a las siguientes personas a las que presentaré en la audiencia bien en forma virtual o en forma presencial, según se disponga por parte del despacho judicial:

NELSON JULIAN VARGAS ESCOBAR, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cedula de ciudadanía # 71776815. Correo electrónico: nelsonjvargas@gmail.com

MILTON CESAR MARULANDA OLARTE, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cedula de ciudadanía # 10027535. Correo electrónico: miltonmarulanda@gmail.com

OSCAR DARIO SALDARRIAGA SALDARRIAGA, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cedula de ciudadanía # 70077393. Correo electrónico: odss@une.net.co

SEBASTIÁN REVUELTA RODRIGUEZ. Mayor de edad, vecino del Municipio de Bello, identificado con la cédula de ciudadanía # 1044508071. Correo electrónico: sebasrr0813@gmail.com

JUAN JOSÉ MESA HENAO, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cedula de ciudadanía # 1044508143. jjmesa96@gmail.com

LUIS MIGUEL RUIZ MORA, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cedula de ciudadanía # 1017219466. luismiguel10c@hotmail.com

Oficio o exhorto: Oficiese o exhórtese al Juzgado 5°. Civil del circuito de Medellín para que traslade a través de copia, todos la prueba documental presentada tanto con la demanda iniciada por Datanet Colombia Network Solutions s. a. s contra el Hospital Pablo Tobón Uribe, que se tramita bajo el radicado 05001310200520180054100, como copia de toda la prueba documental presentada por DATANET Colombia Network Solutions s. a. s. con la respuesta a la demanda de reconvencción.


Adjunto toda la prueba enunciada.

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

Las recibiremos en la secretaria del despacho o en las direcciones enunciadas con la demanda y el llamamiento en garantía.

La del apoderado de DATANET: Carrera 55 # 40 A – 20 oficina 1010 Medellín.
Correo electrónico: gorregop@gmail.com

Con todo respeto,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guillermo de Jesús Orrego Palacio', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat illegible due to the cursive nature of the handwriting.

GUILLERMO DE JESUS ORREGO PALACIO.

C. C. # 70119857 de Medellín

T. P. # 35849 del C. S. de la Judicatura

Guillermo Orrego

De: charly Rubio <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: miércoles, 4 de enero de 2017 2:25 p. m.
Para: Oscar García - ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S
Asunto: pendientes infraestructura

Buenas tardes Juan, la presente para solicitarle comedidamente me colaboren con la siguiente infraestructura:

- 1.tendido de tubería para los puntos de cámaras ubicados en parqueaderos motos.
2. Tramo vertical de la bandeja al rack tipo cerrado ubicado en el cuarto de servidores cuarto técnico.
- 3.El cierre de la tubería para puntos ubicados en el piso de tanques en el edificio técnico.
4. La tubería para cámaras ubicadas en primer piso junto a subestación de edificio técnico.
- 5.Ubicacion de tapas para ducto que cubre el tramo edificio técnico, túnel ya que llevan fibra óptica y cableado de comunicaciones y control de acceso que no es intemperie.
6. Terminacion de la tubería de la red de incendio que va desde edificio técnico hasta TI piso 2 eje 6.
7. Instalacion de los tramos de canaleta en puestos de enfermería de quirófanos, banco de sangre, puesto de vigilante piso 13.
8. Se requiere coraza en la terminacion de cajas 20 x 20 en cada piso de parqueaderos para la ubicación de las cámaras.

Agradezco de antemano toda su colaboracion

Milton Marulanda
Datanet Colombia
Calle 34AA No 80A-29 Medellín, Colombia.
PBX +57(4) 411 45 45 Fax +57(4) 581 20 12
datanet@datanetcolombia.com.co
www.datanetcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"



DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
UNIDAD MECANICA Y FLUIDOS
SEGUIMIENTO BMS

Fecha:	05 Julio del 2017	Acta Numero:	2017-15
Lugar:	Sala de reuniones	Hora:	10:30– 12:00
Asistentes:	Elizabeth Toro (HPTU) Oscar Saldarriaga (HPTU) Edison Velez (HPTU) Daniel Quintero (HPTU) Julian Zapata (HPTU) Wilfer Zuluaga (HPTU) Nelson Vargas (Datanet) Carlos Monsalve (Datanet) Sandra Rivera (Datanet) Milton Marulanda (Datanet) Gustavo Gomez (Aire ambiente) Edison Alvarez (Aire ambiente)		

Objetivo:

1. Hacerle seguimiento a los temas relacionados para el funcionamiento del BMS en el edificio técnico #3

Desarrollo del tema:

AIRE AMBIENTE

1. El Otro si de aire ambiente ya se encuentra en el departamento de jurídica del hospital con fecha de vencimiento del 4 de julio
2. Aire ambiente debe enviar carta a el hospital para cambiar la fecha del otro si y poder ampliarse hasta el 4 de agosto del presente año.
3. Se realiza trabajo por parte de Aire ambiente en la ubicación del sensor de flujo del agua helada, en la tubería que se encuentra entre el edificio técnico 1 y edificio técnico 2.
4. En el piso 9 solo faltan por intervenir 2 habitaciones en el cambio del termostato. Se debe hablar con la jefe de área para la ayuda del trabajo.
5. Se debe configurar de nuevo la ubicación de transmisión en los equipo de aire acondicionado de cirugía, ya que los que iban a ubicar no coincidían en el eje. Se debe esperar que aire ambiente termine la fabricación para poder programar con el servicio.
6. Se debe enviar cronograma de las actividades que hacen falta por realizar para anexarlo al otro si que se encuentra en jurídica.
7. Se siguen los inconvenientes de la desconexión de los puntos de datos en el piso 5. Se debe enviar correo para las empresas que entran a los cuartos técnicos y que no vuelvan a ocurrir estos inconvenientes.
8. Se debe tener cuidado en las desconexiones de los equipos para no afectar las comunicaciones de automatización, esto debido a que se desmonto fan coil de urgencias y le afectó la comunicación de automatización todo el piso 2.
9. En el túnel se encontraron los sensores de CO sin tarjetas y otros sensores dañados. Se debe enviar cotización por parte de Aire ambiente para la reposición.

DATANET

10. Se explica por parte Edison Velez el funcionamiento de los contratos de Datanet en el hospital para la automatización.
11. Carlos Monsalve solicita liquidar el contrato a la fecha y queda en enviar una carta a jurídica para realizar un acuerdo para las tareas pendientes hasta el 28 de julio, pero Elizabeth Toro explica que no se puede liquidar debido a que debe existir un contrato de los trabajos mientras se estén realizando.
12. El Otro si en proceso se debe firmar para poder continuar con el contrato de Datanet para el viernes 7 de Julio.
13. Se debe evaluar el tiempo que se necesita para terminar en un 100% del contrato y poder realizar un cronograma de actividades. Este cronograma debe contener los tiempo de realización y el costo de cada actividad. Datanet queda con la tarea de enviar un correo para definir la fecha de entrega del cronograma.
14. Se debe revisar el contrato de Datanet para aclarar el tema de mantenimientos y garantías en los equipos y sistemas instalados por ellos.
15. Se debe actualizar cronograma de recepciones de sistemas solicitados por Wilfer, ya que a la fecha no se ha iniciado con las actividades y por ende no se cumpliría este cronograma.
16. Se debe ir agilizando por parte de Datanet la documentación que debe presentar con referencia al contrato de Datanet y poderlo entregar al hospital
17. Datanet debe revisar toda la información que se le envió por parte del hospital para poder ajustar cronograma que se debe realizar.
18. Está pendiente temas de ascensores por parte de Datanet para aclarar el tema de las cotizaciones y poder terminar el trabajo. Julian es el encargado de comunicar a OTIS y Datanet. Julian debe realizar reunión entre Otis y Datanet para dejar todos los pendiente por escrito.

Tareas nuevas:

1. **(Aire Ambiente)** Enviar carta solicitando ampliación de contrato
2. **(Aire Ambiente)** Enviar cotización de los sensores de CO que están dañados en el túnel
3. **(Datanet)** Enviar Otro si, firmado y con pólizas.
4. **(Datanet)** Enviar correo para informar la fecha de la realización del cronograma de lo que quedará pendiente.
5. **(Datanet)** revisar contrato para aclarar el tema de garantías y mantenimientos
6. **(Datanet)** Actualizar cronograma de recepciones hecho por Wilfer
7. **(Julian)** Aclarar tema de los pendientes con los ascensores
8. **(Datanet)** Revisar información que envió el hospital

Seguimiento tareas:

1. **(Datanet)** Conectar los televisores con su respectivo cable HDMI.
2. **(Datanet)** Enviar cronograma para las pruebas de los sensores de humo en torre A.
3. **(Wilfer Zuluaga)** Entregar base de datos definitiva para el control de acceso
4. **(Daniel Quintero)** Coordinar entrada a las habitaciones de pisos 8, 9 y 11 para el cambio del termostato
5. **(Wilfer y Julian)** Presupuestar lo faltante en los puntos de datos para electromecánicos
6. **(Wilfer)** Recibir el control de acceso, cámaras e incendio en torre A
7. **(Datanet y Wilfer)** Definir el tema de las puertas de emergencia en torre A
8. **(Datanet)** Enviar fecha de inicio a las recepciones de intrusión, control de acceso, CCTV y detección de incendios
9. **(Datanet)** Pondrá los 6 electroimanes faltantes por contrato de las puertas de emergencia del eje 17, las que están por fuera de contrato, deberá enviar propuesta al hospital
10. **(Wilfer Zuluaga)** plantear la manera de implementar circuitos en UPS para controladoras de control de acceso
11. **(Datanet)** integración de el sistema de aire acondicionado en los quirófanos de torre B. 28 de julio
12. **(Datanet)** Cablear las bomba de agua, planta de emergencia y rectificadores
13. **(Wilfer Zuluaga y Oscar Saldarriaga)** Enviar a Datanet la información y el protocolo por parte de Accequip para el mapeo y configuración de variables de la bomba de incendio
14. **(Julian)** Conectar, configurar y enviar información a Datanet de las UPS de rack
15. **(Aire Ambiente)** Cambio de transmisión en manejadoras de cirugía

Tareas realizadas

1. **(Daniel)** Cambiar de suiche en cuarto de ti ET#3 (realizada)
2. **(Datanet)** Verificar altura mínima de 2,20 metros en las cámaras de parqueadero
3. **(Datanet)** Reconfiguración de las cámaras a partir de 24 de abril
4. **(Daniel Quintero)** Enviar usuarios y permisos para el BMS. 27 de Abril
5. **(Aire Ambiente)** Instalación de servidor y PC en el BMS para el 28 de Abril
6. **(Datanet)** Instalación de licencias en los servidores del BMS. 10 de Abril
7. **(AyC)** Terminar con la infraestructura para todo lo referente a los ascensores
8. **(Aire Ambiente)** Programar pisos 5 y 6. 19 de Abril
9. **(Aire Ambiente)** Realizar de nuevo la verificación de conectividad en los puntos de datos
10. **(Datanet)** Debe verificar el correcto funcionamiento de los puntos de datos de aire ambiente en los cuartos técnicos. Para el jueves o viernes se hará recorrido en conjunto con aire ambiente y Julian
11. **(Datanet)** Según cronograma de actividades no se cumplió con la instalación del modulo de incendio la programación de las 11NVR y las pruebas en los lazos de alarmas
12. **(Julian)** Probar las conexiones de los sistemas en el monitoreo (colofonia y telefonía)

13. **(Oscar Botero)** Indicar la configuración de conexión de las válvulas de incendio. Enviar a Datanet listado con ubicación, número de válvulas y estado (NC y NO)
14. **(Daniel Quintero)** Enviar variables de las bombas de agua
15. **(Datanet)** Entregar 3 sillas para el BMS
16. **(Datanet)** Configuración de las alarmas de intrusión
17. **(Aire Ambiente)** cronograma de actividades con nuevas fechas
18. **(Datanet)** Control de acceso funcionando
19. **(Daniel)** Terminara infraestructura para cablear sistemas de contacto seco
20. **(Datanet)** Instalación de tablero para controlador de agua caliente
21. **(Wilfer y Daniel)** Entregar las variables a monitorear en el BMS para los tableros eléctricos y la planta eléctrica. 8 de Mayo
22. **(Datanet)** Instructivo para el control de acceso
23. **(Gasproject)** informar lo que se necesita para la conexión de las alarmas de la bomba de vacío y compresor de aire medico
24. **(Oscar Saldarriaga)** Enviar a Datanet configuración de electroválvulas de incendio pendientes por programar
25. **(Datanet y TI)** Validar la habilitación de los puertos tanto en los servidores como en los puestos de trabajo en el BMS
26. **(Daniel Quintero)** Enviar a Datanet variables del sistema de iluminación
27. **(Daniel Quintero y Wilfer Zuluaga)** Entregar a Datanet las direcciones ip de cada tablero de aislamiento 30 de junio
28. **(Daniel Quintero)** Enviar a Datanet variables de la bomba de calor
29. **(Daniel Quintero)** Entregar infraestructura para tableros de agua caliente
30. **(Oscar Saldarriaga)** Dar solución al tubo de incendio que está en la caja de paso entre parqueadero y torre A
31. **(Hospital)** Aprobar prórroga del contrato de automatización para Datanet
32. **(Daniel Quintero)** Programar parar el sistema de agua helada de torre A para poder ubicar sensor de flujo
33. **(Daniel y Aire Ambiente)** Se debe reunir para ajustar todos lo referente a las graficas de los pisos y demás áreas
34. **(Aire Ambiente)** Revisar el Otro si y gestionar la respuesta por parte de Aire Ambiente acorde a cronograma real de implementación

Elaboró:

Daniel Quintero

Guillermo Orrego

De: CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA <andresm129@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 26 de julio de 2017 5:33 p. m.
Para: carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Natalia Isaza Jaramillo; charly Rubio; Oscar Dario Saldarriaga; Elizabeth Toro Londoño; Gustavo Adolfo Gutiérrez Soto; Wilfer Andres Zuluaga Alzate; Daniel Antonio Quintero Rincon; gsierra@ieinterventoria.com; William Mauricio Cadavid Vasquez; Oscar David Garcia; nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; Edison Andrés Vélez Ramirez
Asunto: Re: Tablas Inventario suministros y adicionales control acceso

SEÑORES
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
ATENCION: EDISON ANDRES VELEZ
JEFE SECCION INGENIERIA HOSPITALARIA
MEDELLIN.
E.S.D

Cordial saludo,

Por medio del presente queremos informarle que luego de dar observancia a e mail enviado por el HPTU el día de hoy 26 de julio de 2017 en el cual se manifiesta que ustedes no tienen conocimiento de que habían equipos de los diferentes sistemas (CCTV, control de accesos, intrusión y detección de incendios) que se iban a entregar en suministro por parte de Datanet tal como se había establecido en reunión anterior; equipos pertenecientes al contrato de automatización de torre A.

Datanet informa este servidor que el día 2 de mayo de 2017 realizó reunión con la obra (Oscar García) e interventoría (Valentina García) en la cual Datanet explicó la tabla de liquidación del contrato de automatización y los equipos que se entregarían en suministro de dicho contrato.

Luego de esta reunión se sostuvieron otras nuevas con la obra, interventoría y HPTU (Oscar Saldarriaga) en la cual se revisaron las tablas de liquidación del contrato de automatización.

El día 16 de junio de 2017 se realiza nuevamente reunión con obra (Oscar García), interventoría (Gloria Sierra) y HPTU (Oscar Saldarriaga y Edison Vélez), en la cual se revisó el último corte antes de la liquidación del contrato de automatización y se vieron las cantidades totales instaladas a la fecha y cantidades a entregar en suministro.

El día 27 de junio de 2017 se realizó con la obra (Oscar García), interventoría (Gloria Sierra) y HPTU (Oscar Saldarriaga, Edison Vélez y Wilfer Zuluaga) una nueva reunión, en la cual se revisó las cantidades totales instaladas y que éstas no sobrepasaran las cantidades del contrato y nuevamente las cantidades a entregar en suministro por lo que se considera de nuestra parte que estaba todo asimilado en forma total en este sentido.

Por lo anterior Datanet aclara que el personal encargado por parte del HPTU para el contrato de automatización de torre A tenía pleno conocimiento de que habían equipos que se iban a entregar en suministro por parte de Datanet y por ende quienes pueden dar respuesta clara a todos sus interrogantes son ustedes mismos ya que conocen el tema a fondo.

Por ultimo tengo una preocupación alta con todo estos temas ya que el tiempo esta corriendo en contra de todo lo pretendido con el otro si numero 7 que esta en construcción y ademas porque esta entrega de suministro fue un acuerdo al que ya habíamos llegado en reunión anterior y que iba a ser entregado en su totalidad el día 28 de julio de 2017 y serian ingresados para la custodia por parte del HPTU en alguna de las bodegas que a la fecha se encuentran desocupadas ya que todo lo mencionado fue ordenado para esta obra por los intervinientes.

Sin mas comentarios al respecto y esperando una respuesta de fondo al tema,

Atentamente

CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA
CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LOC 103
INFO: 2325389 - 3127701023
ABOGADO CORPORATIVO

Antes de imprimir, piensa si es realmente necesario: podrías evitar la EMISION de hasta 7 kg de CO2 al año.



Antes de imprimir piense en su compromiso con el Medio Ambiente

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

The content of this message can be privileged and confidential information of CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA. If you are not the real addressee, please report it to whom sends it to you and destroy it immediately. Its retention, recording, use or popularization of any purpose is forbidden. This message has been verified with antivirus software; However, CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA is not responsible for his presence in the email or virus attached to the email which can generate damages in the addressee's equipment or programs.

De: Edison Andrés Vélez Ramirez <evelez@hptu.org.co>

Enviado: miércoles, 26 de julio de 2017 2:05:51 p. m.

Para: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co

Cc: andresm129@hotmail.com; carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Natalia Isaza Jaramillo; Charly Rubio; Oscar Dario Saldarriaga; Elizabeth Toro Londoño; Gustavo Adolfo Gutiérrez Soto; Wilfer Andres Zuluaga Alzate; Daniel Antonio Quintero Rincon; gsierra@ieinterventoria.com; William Mauricio Cadavid Vasquez; Oscar David Garcia (electricohptu@arquitecturayconcreto.com) (electricohptu@arquitecturayconcreto.com)

Asunto: RE: Tablas Inventario suministros y adicionales control acceso

Buenas tardes

Nelson, en las diferentes reuniones se ha manifestado de parte de Datanet la no posibilidad de realizar el 100% de la implementación debido a varios pendientes no asociados a ustedes (Infraestructura, información, cableado etc), lo anterior sobre todo para el tema de sistemas electromecánicos. Sin embargo al observar el listado de suministros que no fueron implementados se identifica que más del 70% de estos elementos no están ligados a dicho sistema.

Por lo anterior agradezco se indique en cada suministro la razón por la cual no pudo ser implementado, igualmente para los elementos que sea posible sugiero manifiesten y realicen la instalación para antes del 25 de Agosto de tal manera que solo quede pendiente lo asociado a los sistemas electromecánicos como siempre lo hemos manifestado. Les regreso el archivo, en el mismo adicionamos las observaciones en cuanto al estado de los suministros e instalaciones acorde al último corte entregado por la obra.

La idea con este listado es que nos reunamos esta misma semana para que socialicemos la respuesta que nos enviaran, en un momento les enviare igualmente la citación.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. CONTRATO	CANT. INSTALADA	PRECIO UNITARIO SUMINISTRO USD (CONTRATO)	PRECIO UNITARIO INSTALACIÓN COP (CONTRATO)	TOTAL INSTALACIÓN	TOTAL SUMIN USD
1.4	Impresora de reportes e informes	Un	1	0.00	\$ 145,64	\$ 52,721.89	\$ 52,721.89	\$
1.13	Proyector / Pantalla Inteligente / Video Conferencia / Media Center (para sala de reuniones-crisis)	Un	1	0.00	\$ 657.38	\$ 237,967.10	\$ 237,967.10	\$
2	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO						\$ 0.00	
2.3	Detector de humo/calor tipo fototérmico direccionable	Un	1488	1,477.00	\$ 68.96	\$ 24,963.92	\$ 274,603.07	\$
2.4	Detector de calor por temperatura fija y rata de incremento (direccionable)	Un	65	42.00	\$ 45.15	\$ 16,345.03	\$ 375,935.74	\$ 1

Por la atención gracias

Cordialmente,



EDISON ANDRÉS VÉLEZ R.

Jefe Sección Ingeniería Hospitalaria

Departamento de ingeniería y mantenimiento

Email: evelez@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9950

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia

www.hptu.org.co

De: charly Rubio [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]

Enviado el: lunes, 24 de julio de 2017 11:25 a.m.

Para: Edison Andrés Vélez Ramírez; Oscar Dario Saldarriaga

CC: andresm129@hotmail.com; carlos.granda@datanetcolombia.com.co; nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; Natalia Isaza Jaramillo

Asunto: Tablas Inventario suministros y adicionales control acceso

Buenos días Edison, le ofrezco de antemano disculpas debido a la demora en el envío de la tabla de suministros, la persona encargada de los inventarios tenía una licencia y lastimosamente solo pudimos contar con ella hasta el día de hoy, adjunto dicha tabla haciendo la claridad que los precios incluidos en esta tabla son los del contrato y no los actualizados.

Respecto a los elementos adicionales para el control de acceso, adjunto la tabla; estamos a la espera de la cotización actualizada y la respectiva vigencia de precios por parte del fabricante para suministrar la nuestra y poder revisar la fórmula de reajuste; en esta tabla se adicionan las puertas de las escaleras de descanso del eje 16 de los pisos que actualmente no están en servicio (pisos 5,6,12,14,15).

Agradeciendo la atención prestada,

Milton Marulanda
Datamet Colombia
Calle 34AA No 80A-29 Medellín, Colombia.
PBX +57(4) 411 45 45 Fax +57(4) 581 20 12
datamet@datametcolombia.com.co
www.datametcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Copia Datonet



Medellín Junio 12 de 2017

Hospital Pablo Tobón Uribe

Centro de Documentos

No Radicado	C-2017-00029955
Fecha y Hora	2017-06-12 14:36

Señores:
 Hospital Pablo Tobón Uribe.
 Doctora Elizabeth Toro.
 Gerente Proyecto Institucional TORRE A.
 Copia. Dr. Oscar Dario Saldarriaga.
 Gerente Técnico TORRE A.
 La Ciudad.

ASUNTO: Solicitud de Prórroga Contrato Automatización Contrato CE028.

Cordial Saludo,
 Doctora Elizabeth Toro mediante el presente me dirijo ante usted con el fin de solicitar de la manera más cordial una ampliación en tiempo de 1.5 meses, es decir hasta Julio 28 para la terminación del citado contrato, si se analiza en este tiempo hay cerca de 4 festivos no dominicales que alteran el tiempo de entrega y sustentado en la siguiente información que detallaremos:

1. Ajuste de lo que se tiene actualmente en electromecánicos: Sistemas de Tanques: Agua potable, agua gris, agua tratado y agua caliente.
2. Comisionamiento de BMS:
 - 2.1 Configuración de usuarios operadores: para esto se necesita la apertura de los puertos en los PC's y servidores ubicados en el edificio técnico y DATACENTER para operación de los sistemas acceso, video y BMS.

Calle 34 AA # 80 º 29 PBX: 4114545 Fax: 4139564 email: carlos.granda@datanetcolombia.com.co



www.datanetcolombia.com.co

Medellín - Colombia

- 2.2 Pruebas en campo en conjunto con personal del HPTU: de equipos electromecánicos mencionados anteriormente y subsistemas verticales actuales en la torre A como: acceso, Intrusión, Incendio y Video.
- 2.3 Pruebas de notificación y eventos en campo en el BMS.
3. Pendiente tendido de infraestructura (esto es pendiente de obra) en el sistema de incendio que comunica a parqueaderos con el eje 6 piso 2 TORRE A.
4. Pendiente de instalación de tomas 110V para las cámaras móviles (esto es pendiente de obra) en total son 11 cámaras.
5. Infraestructura para tendido de cable de datos para 2 cámaras en sendero y una móvil en fachada.
6. Registro para cámaras: 2 cámaras en piso 2 puntos fijos parqueadero salida hacia el sendero (esto es pendiente de obra), desmonte y apertura de orificios módulos de madera para 10 cámaras.

Basado en lo expuesto anteriormente sugerimos de forma respetuosa de que en caso de aprobar la ampliación de prórroga, la misma se amplíe en un porcentaje con respecto al proyecto para la emisión de la póliza, ya que lo que falta es prácticamente el Comisionamiento de BMS y temas puntuales de registros de cámaras, adicionalmente la parte de electromecánicos (BMS) representa el 9% del valor global del contrato.

Nuestra organización tiene una propuesta para someterla al análisis de su grupo y está basada en el número de años que tenemos trabajando con ustedes y con el ánimo de que la inversión realizada por la institución que usted representa, se soporte en hechos tangibles, para esto tenemos la siguiente propuesta:



1. BASE DE LA PROPUESTA:

Nuestra organización cuenta actualmente con el mantenimiento de los sistemas de acceso e incendio de la Torre B, proponemos a ustedes sea renovado el contrato vigente por un año más de los mencionados sistemas y dentro de este periodo nuestra organización realizara la mano de obra e ingeniería sin ningún costo adicional de los siguientes verticales pendientes en la TORRE A:

1.1 Sistema de electromecánicos por variables físicas (controladores de campo).

1.2 Sistema de electromecánicos por variables de protocolo.

Cabe anotar que no tenemos entrega a la fecha de los mencionados subsistemas de la infraestructura para poder instalar y programar dichas variables dentro del BMS y que a partir de la entrega de la misma se requiere un número de semanas para programación y pruebas en campo descritas en el cronograma enviado por nuestra organización en el mes de febrero de 2017.

2. BENEFICIOS MUTUOS DE LA PROPUESTA:

2.1 HPTU podrá contar con todas las variables requeridas en el diseño de los pliegos a medida que se entregue la infraestructura.

2.2 HPTU Podrá contar con todo el BMS completo para las variables expuestas por el diseñador.

2.3 HPTU no tendrá un sobrecosto por mano de obra e ingeniería, que son elementos costosos para cualquier implementación de integración de edificios.





2.4 DATANET se beneficia por que puede seguir contando dentro de su portafolio de clientes con el HPTU.

Queremos clarificar que la anterior propuesta se sustenta en el hecho de:

- Se liquide el contrato vigente de automatización CE028 al 28 de julio de 2017.
- Se realice un cronograma claro y detallado en caso de que se apruebe la anterior propuesta, con el fin de que se tengan metas claras y se pueda evaluar los compromisos y el servicio prestado.

Quedamos atentos a cualquier tipo de aclaración o duda.

Atentamente.

Carlos Granda.
Gerencia General.
Datanet Colombia SAS.

Calle 34 AA # 80 * 29 PBX: 4114545 Fax: 4139564 email: carlos.granda@datanetcolombia.com.co



www.datanetcolombia.com.co

Medellin - Colombia

Guillermo Orrego

De: Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2017 9:45 a. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'; 'Edison Andrés Vélez Ramirez'
CC: 'carlos granda'; 'Nelson Vargas'
Asunto: Verificación CCTV

Buenos dia Don Oscar, hago las siguientes observaciones tras la revisión del sistema de CCTV por parte de HPTU y Datanet:

- La cantidad de cámaras que según el HPTU necesitaban corrección era 155 y no 190 como se dijo en la última reunión, muchos de estas 155 fallas no fueron clarificadas y se asumieron como de Datanet, sin embargo hay cámaras con fallas debido a daños realizados por terceros, falta de facilidades, que están suficientemente documentados así mismo después del proceso de verificación inicial hubo otra verificación por parte de HPTU y Expertos (sin la presencia de ningún funcionario de Datanet) donde hubo manipulación indebida de los passwords de las cámaras por lo cual algunas quedaron bloqueadas o no se podían observar en monitoreo.
- Como les comente verbalmente las cámaras de la NVR 4 (la cual presenta problemas) se ubicaron en otras NVR a fin de dejar funcionando el sistema, sin embargo al no tener acceso a dicha NVR las cámaras se continuaran viendo en dos ubicaciones.
- Las cámaras que no presentan enfoque, vlan así como las que no se configuraron por problemas de cableado se dejen tal cual, como quedo contemplando en los compromisos adquiridos entre el HPTU y Datanet.
- Las cámaras ubicadas en parqueaderos continúan con problemas de intermitencia debido a la falta de switches idóneos en cuanto a potencia, esta problemática se ha socializado en varias reuniones con el HPTU y Expertos.
- Las cámaras que presentan cambios mediante password realizados por HPTU y Expertos no serán revisadas ya que los cambios de dichos passwords se realizaron sin informar a Datanet y desconocemos los mismos.
- Las cámaras que presentan líneas horizontales se debe a interferencias o como se observó en varias cámaras a fluctuaciones en las lámparas fluorescentes.

Agradezco la atención prestada,

Milton Marulanda

> Buenas tardes, Después de la revisión de CCTV realizada entre el H ,Jose Daniel y Milton por Datanet se realizo este diagnóstico y encontraron cámaras que debe ser corregidas por programación o siguen con problemas de Wlan, y otras visualizadas por web.

> Para continuar el proceso de entrega y cerrar , hacer los correctivos tanto por parte de Datanet, como por el H.

> Se requiere que se revise y realicemos la reunión d cierre para ver el estado real de CCTV.

> Además de la capacitación técnica pendiente.

> Se ha solicitado acelerar el proceso en estas dos semanas para poder agilizar los pagos ya que en esta época las facturas se cerraran y no se podrá cumplir si no tenemos la recepción y verificación completa.

> Gracias

>

>

> Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

> osaldarriaga@hptu.org.co<<mailto:prestrepo@hptu.org.co>> | Hospital
> Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia |
> Tel(s): (+57 4) 4459 232
> [Descripción: [cid:image001.jpg@01CF9789.D07CB060](#)]
>
> De: Mantenimiento [<mailto:Mantenimiento@hptu.org.co>]
> Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2017 11:44 a.m.
> Para: Oscar Dario Saldarriaga
> Asunto: CCTV
>
>
>
> _____
>
> Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
> Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
> Agradecemos su atención.
>
> MISIÓN
> Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.
>
> VISIÓN
> Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad
> centrado en el ser humano y abierto al mundo
>
> HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
>
> _____
>
> Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su
> destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y con

Milton Marulanda
Datanet Colombia
Carrera 82A No 32EE-69 Medellín, Colombia.
PBX +57(4) 3224631
datanet@datanetcolombia.com.co
www.datanetcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"



ACTA 637

Código: FAP-25

V 01

Fecha de Vigencia: 2013-05-17

Página 1 de 1

Fecha: Noviembre 30 del 2017

Lugar: HPTU

ASUNTO: Entrega de documentación sistema CCTV Torre A

Dirigido a: Ingeniero Oscar Saldarriaga

Se hace entrega de un dvd con la siguiente documentación:

1. Tabla en excell con el listado de las cámaras entregadas en el sistema.
2. Informe de la entrega del sistema.
3. Evidencia de las capacitaciones realizadas al personal operativo.
4. Instructivo de operación del sistema.
5. Manual de operación del sistema de automatización.
6. Manual de mantenimiento del sistema de automatización.
7. Manuales de fábrica de los diferentes equipos del sistema de CCTV.
8. Planos as built de los sistemas de CCTV, acceso e intrusión.

Agradeciendo la atención prestada,

Milton Marulanda
Milton Marulanda
Ingeniero residente
Datanet S.A.S.

Hospital Pablo Tobón Uribe
Centro de Documentos

No Radicado	C-2017-00033261
Fecha y Hora	2017-11-30 16:49



REVISION DE PROYECTOS

Código: FOP-17 V01 Fecha de vigencia: 2015-04-13 Página: 1 de 2

FECHA: Septiembre 12 del 2017

Verifica: Milton Marulanda

CLIENTE: HPTU

No. OT/Ticket:

PROYECTO: HPTU Torre A

Encargado Instalación: actualmente Juan Jose Mesa

UBICACION: Torre A Hospital Pablo Tobon

ALCANCE: Realizar auditoria de manera tal que la entrega del sistema de control de acceso al usuario final sea en óptimas condiciones de funcionamiento y reportando los respectivos eventos en el BMS.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA: Actualmente el sistema presenta varias anomalías atribuibles a la obra y al HPTU; Se encontraron fallas asociadas a aspectos de infraestructura, mal utilización de los dispositivos o desmonte sin aviso por parte del HPTU o de la obra;

- Ausencia de tensión en tomacorriente que alimenta gabinetes:
Piso 9: Cuarto TI eje 6
- Ausencia tapa electroimán:
Piso 11: cuarto TI Eje 16.
Piso 8: Medicamentos y Suministros (B).
- Platina invertida:
Piso 8: Medicamentos y Suministros (A).
- Recubrimiento con goma o cinta doble faz que impide el correcto funcionamiento:
Piso 8:Puerta Vigilante.
Piso 4: Cuarto TI Eje 6, Puerta Vigilante.
- DMA incompletos por mala utilización de puertas:
Piso 9: Salida Emergencia Eje 13
Piso 8: Salida Emergencia Eje 1
Piso 7: Salida Emergencia Eje 1
- Fallas asociadas a infraestructura:
Piso 7
- Puerta Corta Fuego Eje 6 (A) problema con el gato.



REVISION DE PROYECTOS

Código: FOP-17

V01

Fecha de vigencia: 2015-04-13

Página: 2 de 2

- Formulas Adulto Pediátrico problema con el gato.

Piso 4:

- Puerta Corta Fuego Eje 10 (A) el electroimán no reporta debido a problemas con el gato.
- Cuarto TI eje 6: se le aplico goma al electroimán y no reporta
- Puerta vigilante: se le aplico goma al electroimán y no reporta

Piso 2:

- Cortafuegos Eje 4 (B) el electroimán no reporta debido a problemas con el gato.

Piso 1:

- Entrada ascensores sucios: electroimán golpeado no reporta.

Planta Baja 2:

- Puerta escaleras de emergencia eje 16: no posee platina

Planta Baja 3:

- Entrada Bodega 3 puerta con problemas de obra
- Entrada Subestación :electroimán flojo por problemas gato
- Entrada principal Eje 15: falta platina

CALIDAD DE LA INSTALACION: El sistema se encuentra en optimas condiciones de instalación, sin embargo se hace necesario revisar estas fallas ya que son recurrentes y afecta el adecuado funcionamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Platina invertida



Ausencia tapa electroiman



Mala utilización de los dispositivos, deterioro DMA



Ausencia de platina, retiro por parte del HPTU



Ausencia de tensión en tomacorriente



Instalación de cinta doble faz o gomas que impiden el reporte de eventos



Electroimán golpeado en entrada ascensores sucios



PENDIENTES:

- Solicitar al HPTU no retirar dispositivos ni ingerir en el sistema para evitar reprocesos, daños al sistema y posibles pérdidas de garantía.

APTO PARA LA ENTREGA AL CLIENTE: SI NO

Guillermo Orrego

De: VALERIA GRANDA <valeria.granda@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: sábado, 26 de agosto de 2017 11:19 a. m.
Para: 'Samir Jose Kattour Sotomayor'; 'charly Rubio'; gsierra@ieinterventoria.com; 'Oscar Dario Saldarriaga'
CC: 'Elizabeth Toro Londoño'; 'Natalia Isaza Jaramillo'; 'Daniela Perez Ocampo'; 'Datanet Carlos Granda'; 'AyC Esteban'; 'Jaime Arango'; 'Edison Andrés Vélez Ramirez'; 'Julian David Zapata Ramirez'; andresm129@hotmail.com
Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenos días

Queda confirmada la entrega para el día lunes 28 a las 8:00 am.

Feliz día

De: Samir Jose Kattour Sotomayor [mailto:skattour@hptu.org.co]
Enviado el: sábado, 26 de agosto de 2017 7:51 a. m.
Para: charly Rubio; gsierra@ieinterventoria.com; Oscar Dario Saldarriaga
CC: Elizabeth Toro Londoño; Natalia Isaza Jaramillo; Daniela Perez Ocampo; valeria.granda@datanetcolombia.com.co; 'Datanet Carlos Granda'; 'AyC Esteban'; 'Jaime Arango'; Edison Andrés Vélez Ramirez; Julian David Zapata Ramirez; andresm129@hotmail.com
Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenos días a todos,

Podríamos realizarla el lunes a las 8 am.

Saludos,



SAMIR KATTOUR SOTOMAYOR

Jefe Departamento Logística de Suministros

Email: skattour@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9000 – Tel: (574) 445 9129 – Fax: (574) 441 8032

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia – Suramérica

www.hptu.org.co

De: charly Rubio [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2017 03:30 p.m.
Para: gsierra@ieinterventoria.com; Oscar Dario Saldarriaga
CC: Elizabeth Toro Londoño; Natalia Isaza Jaramillo; Daniela Perez Ocampo; valeria.granda@datanetcolombia.com.co; 'Datanet Carlos Granda'; 'AyC Esteban'; Samir Jose Kattour Sotomayor; 'Jaime Arango'; Edison Andrés Vélez Ramirez; Julian David Zapata Ramirez; andresm129@hotmail.com
Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenas tardes lastimosamente en las horas de la mañana el furgón que nos traía los materiales sufrió una avería y debimos realizar el trasbordo en una camioneta personal, como pudieron observar los presentes Datanet desconocía que iba ser abordado a las 2:00 pm por los mismos, la reunión se realizó en la bodega de Datanet, personalmente tenía contemplada como hora de entrega de los insumos al almacén del HPTU a las 4 pm.

Agradezco la atención prestada,

Milton Marulanda

De: gsierra@ieinterventoria.com [mailto:gsierra@ieinterventoria.com]

Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2017 2:55 p. m.

Para: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>

CC: Elizabeth_Toro_Londoño <etoro@hptu.org.co>; Natalia Isaza Jaramillo <nisaza@hptu.org.co>; Daniela Perez Ocampo <dperez@hptu.org.co>; valeria.granda@datanetcolombia.com.co; Datanet Carlos Granda <carlos.granda@datanetcolombia.com.co>; Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>; AyC Esteban <banestk23@hotmail.com>; Samir Jose Kattour Sotomayor <skattour@hptu.org.co>; Jaime Arango <jaimearango@arquitecturayconcreto.com>; Edison_Andrés_Vélez_Ramirez <evelez@hptu.org.co>; HPTU Julian Zapata <ldzapata@hptu.org.co>

Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenas tardes Ing. Oscar Saldarriaga.

El día de hoy nos reunimos Julian Zapata, Wilfer Zuluaga, Daniela Ocampo, Esteban Alzate, Milton Marulanda y Gloria Sierra, en el almacén del hospital para hacer el recibo de los suministros a entregar por parte de Datanet.

Pero aún no han sido recibidos en su totalidad los insumos y faltan las actas de inventario a entregar, por ello se acordó que una vez reciban todo lo faltante, se envíe un correo reprogramando la entrega para el lunes o martes de la próxima semana desde la mañana.

Quedamos atentos a programación,

Arq. Gloria A. Sierra C.
Directora Interventoria

----- Original Message -----

Subject: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

From: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>

Date: Fri, August 25, 2017 7:33 am

To: Samir Jose Kattour Sotomayor <skattour@hptu.org.co>, Edison_Andrés_Vélez_Ramirez <evelez@hptu.org.co>, "Gloria sierra" <gsierra@ieinterventoria.com>, Jaime Arango <jaimearango@arquitecturayconcreto.com>

Cc: Elizabeth_Toro_Londoño <etoro@hptu.org.co>, "Natalia Isaza Jaramillo" <nisaza@hptu.org.co>, Daniela Perez Ocampo <dperez@hptu.org.co>

Buenos días, si se está programado a esta hora.

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Samir Jose Kattour Sotomayor

Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2017 06:18 a.m.

Para: Oscar Dario Saldarriaga; Edison Andrés Vélez Ramirez; Gloria sierra; Jaime Arango

CC: Elizabeth Toro Londoño; Natalia Isaza Jaramillo; Daniela Perez Ocampo
Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenos días Oscar,

Preferiblemente a las 2pm para no tener inconvenientes. Nos puedes ayudar con esto.

Saludos,



SAMIR KATTOUR SOTOMAYOR

Jefe Departamento Logística de Suministros

Email: skattour@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9000 – Tel: (574) 445 9129 – Fax: (574) 441 8032

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia – Suramérica

www.hptu.org.co

De: Oscar Dario Saldarriaga

Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2017 09:40 a.m.

Para: Edison Andrés Vélez Ramirez; Gloria sierra; Jaime Arango; Samir Jose Kattour Sotomayor

CC: Elizabeth Toro Londoño; Natalia Isaza Jaramillo

Asunto: RV: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Importancia: Alta

Buenos días, según lo acordado para la entrega de los suministros que sobran del contrato de automatización y cableado, serán entregados mañana en la tarde

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: VALERIA GRANDA [<mailto:valeria.granda@datanetcolombia.com.co>]

Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2017 08:46 a.m.

Para: Oscar Dario Saldarriaga

CC: carlos granda; nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; Sara Jaramillo; Hayward Charly Rubio

Asunto: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Importancia: Alta

Buenos días Doctor Oscar

Espero se encuentre muy bien. La entrega del suministro de automatización y cableado estructurado se realizara el día de mañana en las horas de la mañana al ingeniero Milton y el la realizara en la tarde al Hospital como habíamos acordado la semana pasada en reunión.

Quedo atenta , feliz día

Cordialmente

Valeria Granda Guzmán

Jefe de compras nacionales e internacionales y bodegaje

PBX: (574) 411 45 45

"EN DATANET HACEMOS LAS COSAS BIEN, PORQUE...QUEREMOS LO QUE HACEMOS"



Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Guillermo Orrego

De: VALERIA GRANDA <valeria.granda@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: miércoles, 30 de agosto de 2017 11:35 a. m.
Para: 'Samir Jose Kattour Sotomayor'; 'charly Rubio'; gsierra@ieinterventoria.com; 'Oscar Dario Saldarriaga'
CC: 'Elizabeth Toro Londoño'; 'Natalia Isaza Jaramillo'; 'Daniela Perez Ocampo'; 'Datanet Carlos Granda'; 'AyC Esteban'; 'Jaime Arango'; 'Edison Andrés Vélez Ramirez'; 'Julian David Zapata Ramirez'; andresm129@hotmail.com
Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenos días

Por motivos personales no he ido a trabajar en estos dos días pero ya se encuentran haciendo la entrega en el almacén el Ingeniero Milton.

Feliz día

De: Samir Jose Kattour Sotomayor [mailto:skattour@hptu.org.co]
Enviado el: miércoles, 30 de agosto de 2017 6:35 a. m.
Para: charly Rubio; gsierra@ieinterventoria.com; Oscar Dario Saldarriaga
CC: Elizabeth Toro Londoño; Natalia Isaza Jaramillo; Daniela Perez Ocampo; valeria.granda@datanetcolombia.com.co; 'Datanet Carlos Granda'; 'AyC Esteban'; 'Jaime Arango'; Edison Andrés Vélez Ramirez; Julian David Zapata Ramirez; andresm129@hotmail.com
Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenos días a todos,

De la entrega parcial realiza el lunes todavía tenemos pendientes:
2 patch cord
1 cámara

Nos gustaría saber cuándo nos entregan los pendientes porque quedaron en entregarlos ayer y no vinieron.

Saludos,



SAMIR KATTOUR SOTOMAYOR

Jefe Departamento Logística de Suministros

Email: skattour@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9000 – Tel: (574) 445 9129 – Fax: (574) 441 8032

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia – Suramérica

www.hptu.org.co

De: charly Rubio [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2017 03:30 p.m.
Para: gsierra@ieinterventoria.com; Oscar Dario Saldarriaga
CC: Elizabeth Toro Londoño; Natalia Isaza Jaramillo; Daniela Perez Ocampo; valeria.granda@datanetcolombia.com.co; 'Datanet Carlos Granda'; 'AyC Esteban'; Samir Jose Kattour Sotomayor; 'Jaime Arango'; Edison Andrés Vélez Ramirez; Julian David Zapata Ramirez; andresm129@hotmail.com
Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenas tardes lastimosamente en las horas de la mañana el furgón que nos traía los materiales sufrió una avería y debimos realizar el trasbordo en una camioneta personal, como pudieron observar los presentes Datanet desconocía que iba ser abordado a las 2:00 pm por los mismos, la reunión se realizó en la bodega de Datanet, personalmente tenía contemplada como hora de entrega de los insumos al almacén del HPTU a las 4 pm.

Agradezco la atención prestada,

Milton Marulanda

De: gsierra@ieinterventoria.com [<mailto:gsierra@ieinterventoria.com>]

Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2017 2:55 p. m.

Para: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>

CC: Elizabeth_Toro_Londoño <etoro@hptu.org.co>; Natalia Isaza Jaramillo <nisaza@hptu.org.co>; Daniela Perez Ocampo <dperez@hptu.org.co>; valeria.granda@datanetcolombia.com.co; Datanet Carlos Granda <carlos.granda@datanetcolombia.com.co>; Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>; AyC Esteban <banestk23@hotmail.com>; Samir Jose Kattour Sotomayor <skattour@hptu.org.co>; Jaime Arango <jaimearango@arquitecturayconcreto.com>; Edison_Andrés_Vélez_Ramirez <evelez@hptu.org.co>; HPTU Julian Zapata <jdzapata@hptu.org.co>

Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenas tardes Ing. Oscar Saldarriaga.

El día de hoy nos reunimos Julian Zapata, Wilfer Zuluaga, Daniela Ocampo, Esteban Alzate, Milton Marulanda y Gloria Sierra, en el almacén del hospital para hacer el recibo de los suministros a entregar por parte de Datanet.

Pero aún no han sido recibidos en su totalidad los insumos y faltan las actas de inventario a entregar, por ello se acordó que una vez reciban todo lo faltante, se envíe un correo reprogramando la entrega para el lunes o martes de la próxima semana desde la mañana.

Quedamos atentos a programación,

Arq. Gloria A. Sierra C.
Directora Interventoria

----- Original Message -----

Subject: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

From: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>

Date: Fri, August 25, 2017 7:33 am

To: Samir Jose Kattour Sotomayor <skattour@hptu.org.co>, Edison_Andrés_Vélez_Ramirez <evelez@hptu.org.co>, "Gloria sierra" <gsierra@ieinterventoria.com>, Jaime Arango <jaimearango@arquitecturayconcreto.com>

Cc: Elizabeth_Toro_Londoño <etoro@hptu.org.co>, "Natalia Isaza Jaramillo" <nisaza@hptu.org.co>, Daniela Perez Ocampo <dperez@hptu.org.co>

Buenos días, si se está programado a esta hora.

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232

De: Samir Jose Kattour Sotomayor

Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2017 06:18 a.m.

Para: Oscar Dario Saldarriaga; Edison Andrés Vélez Ramirez; Gloria sierra; Jaime Arango

CC: Elizabeth Toro Londoño; Natalia Isaza Jaramillo; Daniela Perez Ocampo

Asunto: RE: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Buenos días Oscar,

Preferiblemente a las 2pm para no tener inconvenientes. Nos puedes ayudar con esto.

Saludos,



SAMIR KATTOUR SOTOMAYOR

Jefe Departamento Logística de Suministros

Email: skattour@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9000 – **Tel:** (574) 445 9129 – **Fax:** (574) 441 8032

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia – Suramérica

www.hptu.org.co

De: Oscar Dario Saldarriaga

Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2017 09:40 a.m.

Para: Edison Andrés Vélez Ramirez; Gloria sierra; Jaime Arango; Samir Jose Kattour Sotomayor

CC: Elizabeth Toro Londoño; Natalia Isaza Jaramillo

Asunto: RV: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Importancia: Alta

Buenos días, según lo acordado para la entrega de los suministros que sobran del contrato de automatización y cableado, serán entregados mañana en la tarde

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: VALERIA GRANDA [<mailto:valeria.granda@datanetcolombia.com.co>]

Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2017 08:46 a.m.

Para: Oscar Dario Saldarriaga

CC: carlos granda; nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; Sara Jaramillo; Hayward Charly Rubio

Asunto: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU

Importancia: Alta

Buenos días Doctor Oscar

Espero se encuentre muy bien. La entrega del suministro de automatización y cableado estructurado se realizara el día de mañana en las horas de la mañana al ingeniero Milton y el la realizara en la tarde al Hospital como habíamos acordado la semana pasada en reunión.

Quedo atenta , feliz día

Cordialmente

Valeria Granda Guzmán

Jefe de compras nacionales e internacionales y bodegaje

PBX: (574) 411 45 45

"EN DATANET HACEMOS LAS COSAS BIEN, PORQUE...QUEREMOS LO QUE HACEMOS"



Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE



Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Guillermo Orrego

De: Nelson Vargas <nelson.vargas@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: viernes, 24 de noviembre de 2017 10:30 a. m.
Para: osaldarriaga@hptu.org.co
CC: 'carlos.granda@datanetcolombia.com.co'; Milton Marulanda;
valeria.granda@datanetcolombia.com.co
Asunto: Corte Acta 18 suministro automatización torre A
Datos adjuntos: corte18.xlsx

Seguimiento:	Destinatario	Lectura
	osaldarriaga@hptu.org.co	
	'carlos.granda@datanetcolombia.com.co'	
	Milton Marulanda	Leído: 24/11/2017 11:48 a. m.
	valeria.granda@datanetcolombia.com.co	

Cordial saludo,

Don Oscar le envió el corte perteneciente al acta 18 por suministro para el contrato de automatización. En este corte se incluyen las cantidades que están pendientes por facturar de los ítems que fueron entregados por personal de Datanet en suministro en el almacén del HPTU el día 26 de agosto de 2017.

Quedamos a la espera de su aprobación para proceder con la facturación de este corte.

Si tiene alguna duda me informa.

Atentamente,



NELSON JULIÁN VARGAS E.
TECHNICAL SUPPORT
DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.
CARRERA 82A # 32EE-69 MEDELLÍN - COLOMBIA
E-mail: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co
nelsonjvargas@gmail.com
TELÉFONO: (574) 3224631
CELULAR: (57) 3176574230

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial de DATANET COLOMBIA. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

DATANET COLOMBIA.

Guillermo Orrego

De: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2017 2:29 p. m.
Para: Carlos Granda; 'Nelson Vargas'
Asunto: RV: reunion con Datamet

Buenas tardes ,Carlos y Nelson.
Envié para su conocimiento el cuadro que envié al Dr. Saldarriaga
El ya lo socializo en el H.,
Nelson recuerda enviarme el cuadro final, con las cifras , estuve revisando con el corte final 17 y 18, y no me concilian.
Además el cronograma para hacer la recepción.
La prefectura de los suministros
Así le trabajamos a los dos frentes.
Gracias

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Oscar Dario Saldarriaga
Enviado el: martes, 07 de noviembre de 2017 11:24 a.m.
Para: Luis Guillermo Saldarriaga
Asunto: reunion con Datamet

Buenos días después de la reunión en la oficina de la División Administrativa se acordó hacer una revisión de las cantidades y plan de entrega.
En esta reunión se entregaron por parte de Datamet estos datos para la revisión y hacer cuadro para las entregas y pagos:

Suministro de elementos al almacén Us 19.074,5 sin IVA

Saldo por facturar en el suministro Us 59.776

Suma US 78.850,5

Se debe revisar el estado del anticipo.

En el rubro de instalación (mano de obra) \$ 45.787.232 antes de impuestos

Se define que la recepción y el pago según peso en % del valor del contrato de suministros así:

contrato	US 1.034.000		orden de entrega
Incendio -	253.893,5	25%	3
Acceso -	244.977,65	24%	2
CCTV -	189.175,66	18.29%	1
Alarmas - instrucción -	2.877,75	0.28%	2
Electromecánicos -	67.454,13	6.5%	4
Licencias -	122.015,11	11.8%	1
Servidor		9.8%	3

Con cada sistema entregados se hace el acta , con detalle y soportes , para que cada informe quede como soporte de entrega y se procede a la factura correspondiente según el %, y revisando amortización
Se enviara por Datamet , el cuadro con los valores anteriores y el cronograma de entrega.

Gracias

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Guillermo Orrego

De: carlos.granda@datanetcolombia.com.co
Enviado el: jueves, 26 de abril de 2018 4:23 p. m.
Para: 'Nelson Vargas'
Asunto: RV: DATANET COLOMBIA: Entrega de subsistemas y facturación contrato CE028 Automatización Torre A.

Importancia: Alta

De: carlos.granda@datanetcolombia.com.co <carlos.granda@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2017 8:55 a.m.
Para: 'Luis Guillermo Saldarriaga' <LSaldarriaga@hptu.org.co>
Asunto: DATANET COLOMBIA: Entrega de subsistemas y facturación contrato CE028 Automatización Torre A.
Importancia: Alta

Doctor Luis Guillermo,
Reciba un cordial saludo,
Mediante el presente me dirijo ante usted con el fin de preguntar el estado de la facturación del suministro realizado desde el mes de agosto de 2017 y del subsistema de CCTV de torre A, ya que como pactamos en nuestra reunión en la oficina de dirección administrativa y que consta en el correo enviado en noviembre 7 de 2017 por el doctor Oscar Saldarriaga con copia a usted, una vez entregados los sistemas con sus correspondientes informes por parte de DATANET, lo cual se ha cumplido a cabalidad (este subsistema se terminó de entregar el 23 de noviembre de 2017), el HPTU procedería a autorizar la facturación del subsistema entregado (el porcentaje equivalente dentro del contrato) y de igual forma realizar el pago de la misma dentro de los 3 días siguientes al recibo de la facturación. A la fecha no hemos recibido por parte del HPTU la orden de facturación.

Quedo atento a los comentarios del tema.

Carlos Hernando Granda A.
Gerencia General.
DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.
E-mail: carlos.granda@datanetcolombia.com.co
DIRECCION: CARRERA 80 C N° 34 A 13
Pbx: 322 46 31 fax 581 20 12
Celular: 317 6402722



“En DATANET hacemos las cosas bien, por que ...queremos lo que hacemos”

Antes de imprimir, piensa si es realmente necesario: podrás evitar la emisión de hasta 7 Kg. de CO2 al año.

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico tiene carácter CONFIDENCIAL, está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por el mismo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente o por este medio. Gracias. DISCLAIMER: The information contained in this electronic mail message is CONFIDENTIAL INFORMATION intended only for the use of the individual or entity named below. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender either by telephone or return electronic mail. Thank you.



ACTA DE REUNIÓN CON HONEYWELL

Fecha:	11 de mayo de 2017	Acta Numero:	
Lugar:	HPTU	Hora:	12 m

Asistentes:	Oscar Darío Saldarriaga (HPTU) Oscar Botero (Arquitectura y Concreto) Juan Martinez (Honeywell) Carlos Granda (Datanet Colombia) Milton Marulanda (Datanet Colombia) Nelson Vargas (Datanet Colombia)
-------------	--

Temas a desarrollar en la reunión.	Aclarar algunos puntos relacionados con la integración del sistema de la empresa Otis y la implementación de un sistema BMS
------------------------------------	---

Desarrollo

Esta reunión se realiza luego de un comunicado enviado vía correo electrónico por el ING. Oscar Darío Saldarriaga el día miércoles 10 de mayo de 2017, y en el cual se manifiesta una preocupación por parte del HPTU en relación a la integración del sistema Prowatch del fabricante Honeywell y el sistema Compass del fabricante Otis, y en la cual se solicita una respuesta directa por el fabricante Honeywell.

Ante las dudas manifestadas, se pide la reunión urgente de parte de Honeywell y Datanet, esta reunión se hace en la oficina de Ing. Se invita también a la Interventoria ,pero no está presente en el hospital, a la hora de la reunión

En cuanto al tema de la integración entre el sistema Prowatch de Honeywell y el sistema Compass de Otis, el ingeniero Juan Martinez informa que en la matriz de compatibilidad actual de Honeywell no está avalada ningún tipo de integración entre el sistema Prowatch y Otis, y explica que el desarrollo de integración realizada por una empresa tercera en Estados Unidos emplea licencias HSDK, lo que indica que dicha empresa tercera realizó un desarrollo a la medida para esta integración. El ingeniero Juan Martinez también explica que al emplear una licencia HSDK para el desarrollo se requiere interactuar con la base de datos del sistema Prowatch lo que puede ocasionar daños en el mismo. El ingeniero Juan Martinez también realiza la claridad de que al ser esta integración implementada por la empresa tercera en Estados Unidos un desarrollo a la medida, el HPTU quedaría condicionado a que en la eventualidad de un futuro servicio por garantía este sólo pueda ser atendido por la empresa quién desarrollo la integración. El ingeniero Juan Martinez manifiesta que la opción para



ACTA DE REUNIÓN CON HONEYWELL

solucionar el problema de integración entre el sistema Prowatch y Otis, es que el HPTU le solicite a la empresa Otis que entregue la información empleando un protocolo abierto (Bacnet), de esta forma se podría implementar la integración solicitada.

En cuanto a puesta en servicio de un sistema BMS, el ingeniero Juan Martinez de Honeywell explica que para el integrador, en este caso Datanet Colombia, es de vital importancia contar con toda la información necesaria y la cual debe ser suministrada por el cliente. El ingeniero Juan Martinez explica que con dicha información el integrador inicia un proceso de configuración y puesta a punto de cada una de las variables de los diferentes sistemas incluidos en el BMS, y que dicho proceso toma su debido tiempo de adecuación y ajustes. Honeywell está en contacto permanente con los integradores y esta pendiente de atender cualquier duda o requerimiento tecnico y apoyo.

Por último, el ingeniero Juan Martinez se pone a completa disposición del HPTU para tratar cualquier tema ya sea de tipo técnico o comercial y estará presto a resolver cualquier inquietud.

Se Agradece al Ingeniero Juan Martinez de Honeywell y a Datanet por su respuesta y presencia oportuna , para aclarar directamente del fabricante las dudas presentadas.

Carlos Granda (Datanet Colombia)

Oscar Botero (Arquitectura y Concreto)

Nelson Vargas (Datanet Colombia)

Milton Marulanda (Datanet Colombia)

Oscar Darío Saldarriaga (HPTU)

Guillermo Orrego

De: Luis Guillermo Saldarriaga <LSaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2017 9:18 a. m.
Para: carlos.granda@datanetcolombia.com.co
CC: Oscar Dario Saldarriaga
Asunto: Re: DATANET COLOMBIA: Entrega de subsistemas y facturación contrato CE028 Automatización Torre A.
Datos adjuntos: image001.gif; image002.jpg

Buenos días Carlos, gracias por tu mensaje. Agradezco tu paciencia hasta el regreso de Oscar Dario la semana entrante para que definamos estos pendientes. Gracias por tu ayuda. Saludos,

Luis Guillermo Saldarriaga C.
Enviado desde mi iPhone

El 5/12/2017, a la(s) 9:01 a. m.,
"carlos.granda@datanetcolombia.com.co<mailto:carlos.granda@datanetcolombia.com.co>"
<carlos.granda@datanetcolombia.com.co<mailto:carlos.granda@datanetcolombia.com.co>> escribió:

<image001.gif>

Doctor Luis Guillermo,

Reciba un cordial saludo,

Mediante el presente me dirijo ante usted con el fin de preguntar el estado de la facturación del suministro realizado desde el mes de agosto de 2017 y del subsistema de CCTV de torre A, ya que como pactamos en nuestra reunión en la oficina de dirección administrativa y que consta en el correo enviado en noviembre 7 de 2017 por el doctor Oscar Saldarriaga con copia a usted, una vez entregados los sistemas con sus correspondientes informes por parte de DATANET, lo cual se ha cumplido a cabalidad (este subsistema se terminó de entregar el 23 de noviembre de 2017), el HPTU procedería a autorizar la facturación del subsistema entregado (el porcentaje equivalente dentro del contrato) y de igual forma realizar el pago de la misma dentro de los 3 días siguientes al recibo de la facturación. A la fecha no hemos recibido por parte del HPTU la orden de facturación.

Quedo atento a los comentarios del tema.

Carlos Hernando Granda A.

Gerencia General.

DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.

E-mail:

carlos.granda@datanetcolombia.com.co<mailto:carlos.granda@datanetcolombia.com.co>

DIRECCION: CARRERA 80 C N° 34 A 13

Pbx: 322 46 31 fax 581 20 12

Celular: 317 6402722

<image002.jpg>

“En DATANET hacemos las cosas bien, por que ...queremos lo que hacemos”

Antes de imprimir, piensa si es realmente necesario: podrás evitar la emisión de hasta 7 Kg. de CO2 al año.

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico tiene carácter CONFIDENCIAL, está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por el mismo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente o por este medio. Gracias. DISCLAIMER: The information contained in this electronic mail message is CONFIDENTIAL INFORMATION intended only for the use of the individual or entity named below. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender either by telephone or return electronic mail. Thank you.

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Guillermo Orrego

De: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2017 5:04 p. m.
Para: Milton Marulanda; 'carlos granda'; 'Nelson Vargas'
CC: Edison Andrés Vélez Ramirez
Asunto: RV: CCTV
Datos adjuntos: CCTV.pdf

Buenas tardes, Después de la revisión de CCTV realizada entre el H ,Jose Daniel y Milton por Datamet se realizo este diagnóstico y encontraron cámaras que debe ser corregidas por programación o siguen con problemas de Wlan, y otras visualizadas por web.

Para continuar el proceso de entrega y cerrar , hacer los correctivos tanto por parte de Datamet, como por el H. Se requiere que se revise y realicemos la reunión d cierre para ver el estado real de CCTV.

Además de la capacitación técnica pendiente.

Se ha solicitado acelerar el proceso en estas dos semanas para poder agilizar los pagos ya que en esta época las facturas se cerraran y no se podrá cumplir si no tenemos la recepción y verificación completa.

Gracias

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Mantenimiento [mailto:Mantenimiento@hptu.org.co]
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2017 11:44 a.m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga
Asunto: CCTV

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Guillermo Orrego

De: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: viernes, 12 de mayo de 2017 11:47 a. m.
Para: Gustavo Adolfo Gutiérrez Soto; LUIS GUSTAVO MARTÍNEZ ECHEVERRI;; Jaime Arango; HPTU - GONZALO RESTREPO; Edison Andrés Vélez Ramirez; Elizabeth Toro Londoño; carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Nelson Vargas; Andres Felipe Pineda Cuartas; Luis Guillermo Saldarriaga; Oscar Botero - ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A
CC: Juan A. Londoño - Alpa Electric
Asunto: Acta reunion Honeywell- control acceso
Datos adjuntos: ACTA OSCAR DARIO.doc

Buenos días, envié acta de la reunión sostenida con el representante para el grupo Andino de Honeywell security and fire, Ingeniero Juan Martinez Bermudez, esta reunión fue solicitada por Datanet y Honeywell, debido a un correo que envié a raíz de las dudas presentadas en referencia a la integración y programación del sistema de control de acceso con el sistema COMPASS de Otis.

Se cito en forma urgente, porque no se tenía agenda , pero por la urgencia e importancia, el Ing Martinez de Honeywell viajo , para dar respuesta, la Interventoria no asistió, porque no estaba en ese momento en el H.

Gracias

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

Visite nuestro portal web www.hptu.org.co

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra política de manejo de datos en <http://www.hptu.org.co/hptu/es/noticias/716-noticias-2013>

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser Hospital Universitario líder, referente, centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes, comprometido con la comunidad y trascendiendo al mundo.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

De: Milton Marulanda [dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: jueves, 02 de febrero de 2017 5:55
Para: 'HPTU - OSCAR BOTERO'
CC: 'Oscar García - ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S'
Asunto: cableado multipar ascensores

Buenos dias don Oscar, ya se tendieron los cables multipar de los ascensores sucios, los ascensores externos y los ascensores internos,asi mismo la pequeña troncal que uniria a edificio técnico con planta baja 1, le ruego comedidamente me colabore con dos situaciones, la primera falta infraestructura para llegar a los cuartos de maquinas ubicados en piso 15 y segundo para poder ingresar a los controles de los ascensores que no tienen cuarto de maquinas necesitamos el acompañamiento y las llaves de los señores de Otis, en este momento lo que mas nos retrasa es el ultimo punto.

Agradezco toda su colaboración y atención brindada,

Milton Marulanda

De: Edison Andrés Vélez Ramirez <evelez@hptu.org.co>
Enviado el: jueves, 1 de junio de 2017 9:08 a. m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga
CC: Daniel Gomez Zuluaga; Nelson Vargas; Wilfer Andres Zuluaga Alzate
Asunto: RE: Informe cámaras torre A

Buenos días

Don Oscar, al respecto le solicitamos el favor a Milton de que levantara inventario de todo lo que haga falta a nivel de registros, infraestructura y eléctrico para terminar el contrato. Con ello realizamos recorrido con el fin de gestionar lo que podamos hacer fácilmente con LIMA y/o Zugom y presupuestaríamos lo que por su magnitud deba ser llevado a comité. Igualmente la idea es con dicho inventario realizar recorrido. Queremos que no se generen pedidos por partes y de una vez por todas gestionar todo lo requerido.

Nelson, al respecto agradezco indicarnos si ya se cuenta con el listado total para programar el recorrido en lo posible esta misma semana.

Cordialmente,



EDISON ANDRES VÉLEZ R.

Jefe Sección Ingeniería Hospitalaria
Departamento de ingeniería y mantenimiento

Email: evelez@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9950

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia

www.hptu.org.co

De: Oscar Dario Saldarriaga
Enviado el: jueves, 01 de junio de 2017 08:59 a.m.
Para: Edison Andrés Vélez Ramirez
CC: Daniel Gomez Zuluaga; Nelson Vargas
Asunto: RV: Informe cámaras torre A

Buenos días Edison , en este listado veo 5 pendientes con necesidad de trabajos que son de fácil ejecución, de obra civil.

Aparte de los problemas de configuración,

Es posible que estos pendientes de obra los atendamos y facilitemos la revisión y programación.

En otro correo, si envió con copia a la obra , para que revise el porque faltan varios tomas a 110 V.

Gracias

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232

De: Nelson Vargas [mailto:nelson.vargas@datanetcolombia.com.co]

Enviado el: jueves, 01 de junio de 2017 08:22 a.m.

Para: Daniel Antonio Quintero Rincon; Edison Andrés Vélez Ramirez; Wilfer Andres Zuluaga Alzate; Oscar Dario Saldarriaga

CC: carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Milton Marulanda

Asunto: Informe cámaras torre A

Cordial saludo,

Por medio del presente envío informe de cámaras de torre A de acuerdo a revisión realizada por personal de Datanet en la cual se chequearon cada una de las cámaras. En la tabla en la columna "Observaciones" se especifica las cámaras cuyos puertos en el suiche de red no han sido configuradas por TI (puerto no configurado). Se requiere que TI proceda con la configuración de dichos puertos para poder tener visualización de dichas cámaras en el BMS. Adicionalmente, se realizan observaciones de algunos registros que se requieren para poder realizar la conexión del patchcord de algunas cámaras. Estos registros ya habían sido solicitados a la obra. También se realiza observación de algunas cámaras que presentan bloqueo por letrero y que no permiten una visualización adecuada.

Al día de hoy hay 222 cámaras con visualización en el BMS.

Si tienen alguna duda en relación a la tabla anexada nos informan.

Atentamente,



NELSON JULIÁN VARGAS E.

TECHNICAL SUPPORT

DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.

CARRERA 80C # 34A-13 MEDELLÍN - COLOMBIA

E-mail: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co

nelsonjvargas@gmail.com

TELÉFONO: (574) 4114545

CELULAR: (57) 3176574230

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial de DATANET COLOMBIA. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

DATANET COLOMBIA.

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

Visite nuestro portal web www.hptu.org.co

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra política de manejo de datos en

<http://www.hptu.org.co/hptu/es/noticias/716-noticias-2013>

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser Hospital Universitario líder, referente, centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes, comprometido con la comunidad y trascendiendo al mundo.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

Visite nuestro portal web www.hptu.org.co

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra política de manejo de datos en

<http://www.hptu.org.co/hptu/es/noticias/716-noticias-2013>

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser Hospital Universitario líder, referente, centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes, comprometido con la comunidad y trascendiendo al mundo.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Guillermo Orrego

De: charly Rubio <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: viernes, 5 de mayo de 2017 2:05 p. m.
Para: 'carlos granda'; 'Nelson Vargas'
Asunto: Descargos Oscar Garcia

Buenos días Carlos, se requiere de su urgente colaboración para el cableado del sistema de detección de incendios en edificio de parqueaderos ya que las obras de infraestructura están realizadas desde la semana pasada y al día de hoy no se ha ejecutado ninguna actividad de cableado.

RTA: no se puede efectuar el cableado de incendio porque se necesita infraestructura y la aprobación escrita del hospital para cablear de la manera en la que sugiere Oscar Garcia.

Cabe aclarar que como no se pasó requerimiento de infraestructura por parte de ustedes y en su momento en reunión de diseño se dijo que era suficiente con un tubo de 1" como vertical, para el tendido del cableado de los pisos. En esa misma ocasión y para los pases entre cajas de piso, se quedó de entregar a ustedes la medida de la coraza necesaria para hacer el pase entre cajas, de forma que se aislara este cable totalmente y así poder llevar este cableado hasta planta baja 1 y posteriormente subirlo a piso 2.

RTA: Desde el mes de febrero se solicita de manera verbal y escrita al maestro Arenas (quien siempre presenta el Oscar Garcia como su encargado), a Oscar Garcia y al Ingeniero Botero, en este momento la transición entre el tubo de 1" vertical y la coraza que se instalaría sería un tramo de tubo PVC de 3", así mismo nosotros no instalamos coraza esa labor le corresponde a otra empresa.

Por otra parte le informo que el día de hoy tuve una fuerte discusión con el señor Milton Marulanda por este tema, dado que las condiciones con las que quedamos anteriormente para él nunca se hablaron y me pareció una falta de respeto que me desafiara por este mismo tema y se dirigiera groseramente hacia mí alzando la voz, lo cual no iba a permitir y desafortunadamente me dirigí hacia él en los mismo términos, caso que puso en aviso a la propia vigilancia del HPTU.

RTA: La fuerte discusión que nombra Oscar Garcia se dio porque me faltó al respeto hay que hacer claridad al respecto, y si algo tengo claro es que el personal de Datanet no tiene contratado el tendido de coraza, el señor fue el que se exaltó y nos dejó en sitio sin terminar de realizar la revisión la cual no estaba contemplada y ambos en común acuerdo decidimos hacer.

Considero que para temas de obra y para los casos de actividades pendientes, ustedes son los que deben de llevar los seguimientos, las supervisiones y estar al tanto de las actividades, ya que para eso tienen residente y encargado, dado que me queda muy complicado estar pendiente de toda la parte de liquidación de obra de todos los contratos y a la vez haciéndoles las supervisiones a ustedes. Digo lo anterior ya que la infraestructura de todo punto fijo de parqueaderos estaba lista y al día de hoy su residente viene a decir que no estaba lista sin siquiera revisar y me tocó ir a mostrarle que ya estaba hasta planta baja, solo faltando la infraestructura de las cajas de paso y una infraestructura que él dice que se tiene que hacer pero que nunca pasaron requerimiento de esta como adicional ó que hayan hecho la afirmación que faltaba sabiendo que la tubería existente estaba instaladas de hace meses atrás.

RTA: La infraestructura viene con seguimiento casi a diario y recordándole una y otra vez al maestro Arenas la necesidad de la misma al día de hoy no está lista y no comprendo la manera desafiante en la cual nos amenaza con la liquidación, Oscar Garcia siempre ha tenido al maestro Arenas como su encargado lastimosamente al parecer no le comunica lo que se habla en los recorridos quizás por ello se deba la falta de tanta infraestructura o que suceda el mismo evento del cableado de los ascensores que en un correo decía que se había instalado una semana antes y cuando verifico Don Oscar Botero aun no estaba.

Por favor tomemos conciencia de la urgente necesidad de terminar las actividades y que no es necesario levantar la voz, ni faltar al respeto por labores que nos conviene terminarlas en conjunto. Para evitar nuevamente este tipo de

situaciones necesito seguirme entendiendo únicamente con el señor Nelson Vargas para temas de obra ya que Milton aparte de tomar este tipo de comportamientos, desde hace meses hacia atrás no me contesta el celular para necesidades de obra y me toca recurrir al propio Nelson.

RTA: Todos estamos enfocados en terminar la obra con calidad y eficiencia, no se hace necesario protagonismo ya pasamos a la historia por contribuir con tan hermosa obra, debemos aprender a tratar a las demás personas indiferente a tal o cual condición, profesión, credo o raza, respecto al teléfono he tenido problemas con la cobertura en otras ocasiones considero que tengo derecho a mi espacio de almuerzo, así mismo Oscar García no me ha contestado y lo he comprendido, por mi parte las discusiones de obra no deben tener tanta trascendencia sin embargo respeto sus motivaciones.

Milton Marulanda
Datanet Colombia
Calle 34AA No 80A-29 Medellín, Colombia.
PBX +57(4) 411 45 45 Fax +57(4) 581 20 12
datanet@datanetcolombia.com.co
www.datanetcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"

Guillermo Orrego

De: Nelson Vargas <nelson.vargas@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2017 4:15 p. m.
Para: osaldarriaga@hptu.org.co
CC: 'carlos.granda@datanetcolombia.com.co'; andresm129@hotmail.com; Milton Marulanda
Asunto: Auditoría sistemas control de accesos HPTU Torre A
Datos adjuntos: Reporte revision control acceso.pdf
Importancia: Alta

Cordial saludo,

Don Oscar como es de su conocimiento Datanet ha estado realizando una serie de auditorías internas en campo para verificar el estado de las instalaciones. En dichas auditorías se encontraron varias fallas en el sistema de control de accesos tales como: platinas de electroimanes desconectadas, estados de puerta dañados, electroimanes golpeados, electroimanes sin tapa, etc. Lo que no entendemos es que en varias reuniones sostenidas con el HPTU se les solicitó el favor de que el HPTU no realizara ningún tipo de desmonte de equipos y/o accesorios y que le fuera notificado a Datanet para que nosotros nos encargáramos de realizar dichas actividades y no afectar el funcionamiento de los diferentes sistemas. Lo que encontramos en las auditorías es muy grave porque no es posible dar inicio a un otrosí con esta cantidad de fallas en el sistema de control de accesos. Le adjunto el informe realizado por el ingeniero Milton Marulanda de Datanet en el cual se describen cada una de las fallas encontradas en el sistema de control de acceso y que se deben a errores por mala manipulación por parte del HPTU, fallas en infraestructura, etc.

Le pido el favor de evaluar con el HPTU cómo van a dar solución a estas fallas y que nos informen al respecto para tomar una decisión con respecto al otrosí. Como le mencioné anteriormente, no es posible iniciar un otrosí con esta cantidad de fallas presentadas y las cuales no son imputables a Datanet.

Atentamente,



NELSON JULIÁN VARGAS E.
TECHNICAL SUPPORT
DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.
CARRERA 80C # 34A-13 MEDELLÍN - COLOMBIA
E-mail: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co
nelsonjvargas@gmail.com

TELÉFONO: (574) 3224631

CELULAR: (57) 3176574230

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial de DATANET COLOMBIA. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

DATANET COLOMBIA.

carlos.granda@datanetcolombia.com.co

De: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2017 10:25 a. m.
Para: Nelson Vargas
CC: carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Milton Marulanda; Wilfer Andres Zuluaga Alzate; Edison Andrés Vélez Ramirez
Asunto: RE: Camaras piso 8 parqueaderos

Buenos días Gracias por aclarar, lo revisaremos

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Nelson Vargas [mailto:nelson.vargas@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2017 09:04 a.m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga
CC: carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Milton Marulanda
Asunto: RV: Camaras piso 8 parqueaderos

Cordial saludo,

Don Oscar le reenvío correo de Milton en el cual se da respuesta al tema de las cámaras del piso 8 de parqueaderos.

Atentamente,



NELSON JULIÁN VARGAS E.
TECHNICAL SUPPORT
DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.
CARRERA 80C # 34A-13 MEDELLÍN - COLOMBIA
E-mail: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co
nelsonjvargas@gmail.com
TELÉFONO: (574) 3224631
CELULAR: (57) 3176574230

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial de DATANET COLOMBIA. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

DATANET COLOMBIA.

De: Milton Marulanda [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]

Enviado el: martes, 12 de septiembre de 2017 06:31 p.m.

Para: 'NELSON VARGAS'; 'CARLOS GRANDA'

Asunto: Camaras piso 8 parqueaderos

Buenas noches Nelson, las cámaras de piso 8 parqueaderos están efectivamente cableadas sin embargo en su momento se aclaró con el HPTU, Obra e interventoría que en parqueaderos solamente se instalarían 52 cámaras las cuales fueron contratadas :

Piso 1: 9 cámaras (1 cámara ubicada en puntos fijos)

Piso 2: 7 cámaras (1 cámara ubicada en puntos fijos)

Piso 3: 7 cámaras (1 cámara ubicada en puntos fijos)

Piso 4: 7 cámaras (1 cámara ubicada en puntos fijos)

Piso 5: 7 cámaras (1 cámara ubicada en puntos fijos)

Piso 6: 7 cámaras (1 cámara ubicada en puntos fijos)

Piso 7: 7 cámaras (1 cámara ubicada en puntos fijos)

Piso 8: 1 cámara ubicada en puntos fijos.

Instalar las 8 que se necesitan en piso 8 haría parte actividades posteriores al otro sí, ya que se atrasarían las entregas de los respectivos sistemas además de crear confusión respecto a la liquidación del contrato.

Agradezco la atención prestada, feliz noche.

Milton Marulanda



Libre de virus. www.avast.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial

del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Guillermo Orrego

De: charly Rubio <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: jueves, 18 de mayo de 2017 8:41 a. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'
CC: 'Wilfer Andres Zuluaga Alzate'; 'CARLOS GRANDA';
'oscarbotero@arquitecturayconcreto.com'
Asunto: RV: RV: Definiciones incendio, cctv

Buenos Dias, Don Oscar le ruego comedidamente me colaboren con las definiciones resaltadas en amarillo ya que se solicitaron en correos anteriores y verbalmente y aun no tengo respuesta, esto perjudica la instalación del sistema de detección de incendio.

Agradezco toda la atención prestada, feliz dia.

Milton Marulanda

Buenas noches Gloria, la presente con el fin de solicitarle comedidamente me colabore con tres definiciones:

- Cantidad y ubicación de detectores de humo en la subestación de Torre A, el beam detector ya fue trasladado como usted me solicito.
- Los registros de los puntos fijos aun no se han hecho y debemos entregar cuanto antes las cámaras funcionando y en el estado actual no se pueden instalar los patch core.
- El vertical de detección de incendio de puntos fijos parqueaderos esta llegando a un tubo de 3'' luego continuaría en un tramo de coraza de 1'' hasta una caja ubicada en planta baja, por favor me indica si podemos cablear?.

Agradezco su atención,

Milton Marulanda



Libre de virus. www.avast.com

Guillermo Orrego

De: charly Rubio <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: miércoles, 12 de abril de 2017 2:43 p. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'
Asunto: Incendio y comunicaciones piso 1 locales

Buenas tardes Don Oscar, en recorrido el día de hoy con Esteban de HPTU, encontramos que ya se podía instalar bases y sensores en varios locales de piso 1, (esta actividad ya se realizó tras el recorrido), las actividades pendientes como son la estación manual completa y los sensores en los otros locales necesitan definición e infraestructura, Esteban ya quedó al tanto y nos informará cuando podemos terminar dichas actividades.

Respecto a la farmacia estamos a la espera de la finalización de la infraestructura de comunicaciones y respecto a incendio ya se realizó el cableado pero para instalar bases y sensores debemos esperar los acabados en dry Wall.

Agradeciendo la atención prestada, feliz día.

Milton Marulanda
Datanet Colombia
Calle 34AA No 80A-29 Medellín, Colombia.
PBX +57(4) 411 45 45 Fax +57(4) 581 20 12
datanet@datanetcolombia.com.co
www.datanetcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"

carlos.granda@datanetcolombia.com.co

De: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2017 7:03 a. m.
Para: dirobrahptu
CC: Carlos Granda; Nelson Datanet; Edison Andrés Vélez Ramirez
Asunto: RE: Personal recepcion sistemas torre A

Buenos días, esta recepción como se ratifico y definió ayer , será por el H. a cargo de la gerencia técnica, con la interventoria y la obra que son los que han manejado el contrato en su administración delegada.
Para conocimiento de lo recibido y estar pendiente de su aplicación y disposición, estará también Edison Velez, por ingeniería.

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: dirobrahptu [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: martes, 15 de agosto de 2017 04:37 p.m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga
CC: Carlos Granda; Nelson Datanet
Asunto: Personal recepcion sistemas torre A

Buenas tardes Don Oscar la presente es con el fin de solicitar comedidamente me indique el personal que por parte del HPTU estara encargado de la recepcion de los diferentes sistemas.

Agradeciendo la atencion prestada,

Milton Marulanda

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

De: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: jueves, 29 de junio de 2017 6:51 a. m.
Para: Nelson Vargas; Milton Marulanda
CC: carlos.granda@datanetcolombia.com.co
Asunto: RV: Valvulas verticales HPTU

Importancia: Alta

Buenos días, Hoy se tiene lista la caja modificada para terminar la instalación de las válvulas de RCI, La ruta también se definió, estar pendiente a las 2 pm para verificar y definir la instalación de esta cable.

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Wilfer Andres Zuluaga Alzate
Enviado el: miércoles, 28 de junio de 2017 09:22 p.m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga; Edison Andrés Vélez Ramirez
CC: Daniel Antonio Quintero Rincon
Asunto: RE: Valvulas verticales HPTU

Cordial saludo don Oscar.

El día de mañana al medio día o antes si nos es posible estará lista la caja y las tapas en la tarde a más tardar el viernes en la mañana, Accequip estuvo en el hospital hoy en la tarde para resolver las dudas de cableado de control de las válvulas que faltaban y en el recorrido de hoy en la mañana se determinó la nueva ruta para el cableado de detección del edificio de parqueaderos debido a la inundación de las cajas para lo cual se mostrará la ruta mañana a las 2PM para validar que faltantes de infraestructura pueden haber en esta nueva ruta, por favor reenviar este correo a Datanet para que estén atentos a cada punto.

Quedo atento a comentarios.
Gracias.

De: Oscar Dario Saldarriaga
Enviado el: miércoles, 28 de junio de 2017 16:21
Para: Wilfer Andres Zuluaga Alzate; Edison Andrés Vélez Ramirez
Asunto: RV: Valvulas verticales HPTU

Buenas tardes, para terminar la instalación de las válvulas de la RCI, en la parte de monitoreo, se debe adecuar una caja que se instaló de 4x2, y no se acomodan los elementos, porque son dos válvulas , en la entrada al túnel.

Están solicitadas por DATANET, y las tapas eléctricas para tapar y adecuar estos espacios donde no hay lectoras o empalmes, (estos los terminaba la parte eléctrica.)

Punto 1 y 2

Ver abajo

1. Para la instalación de módulos monitor para dos válvulas en calderas se necesita cambiar una caja 2 x 4 instalada por una 12 x 12.
2. Para la adecuación solicito comedidamente 40 tapa lisas y 12 tapas troqueladas para el sistema detección incendio.

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Oscar Dario Saldarriaga

Enviado el: miércoles, 28 de junio de 2017 07:05 a.m.

Para: 'HPTU - MARYLUZ PANESSO'; 'HPTU - OSCAR BOTERO'; 'gsierra@ieinterventoria.com'

CC: Wilfer Andres Zuluaga Alzate

Asunto: RV: Valvulas verticales HPTU

Buenos días,

Maryluz y Oscar, necesitamos que Accequip , nos aclare la codificación de estas válvulas verticales, pues como ya lo envié en otro correo, no están con los códigos de colores , que entrego Accequip, Es necesario entregar este código de colores, lo mas pronto posible , para terminar este proceso.

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Milton Marulanda [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]

Enviado el: jueves, 15 de junio de 2017 05:48 a.m.

Para: Oscar Dario Saldarriaga

Asunto: Valvulas verticales HPTU

Buenas noches Don Oscar, para la finalización de la instalación de modulos monitor en válvulas verticales le agradezco si me colaboran con lo siguiente:

3. Hay dos códigos de colores diferentes al proporcionado por Accequip a través del HPTU motivo por el cual no se les a conectado, sin embargo se les instalo el modulo monitor:
 - Piso 2 eje 13,
 - Planta baja 2 eje 13,
4. El cuarto eléctrico eje 16 piso 8, se encuentra condenado a pesar de realizar varios recorridos con personal de Expertos al parecer no hay llaves de dicho cuarto.
5. Para la instalación de modulos monitor para dos válvulas en calderas se necesita cambiar una caja 2 x 4 instalada por una 12 x 12.
6. Para la adecuación solicito comedidamente 40 tapalisas y 12 tapas troqueladas para el sistema detección incendio.

Agradezco comedidamente toda la atención prestada, feliz noche.

Milton Marulanda



Libre de virus. www.avast.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

Visite nuestro portal web www.hptu.org.co

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra política de manejo de datos en <http://www.hptu.org.co/hptu/es/noticias/716-noticias-2013>

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser Hospital Universitario líder, referente, centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes, comprometido con la comunidad y trascendiendo al mundo.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

Visite nuestro portal web www.hptu.org.co

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra política de manejo de datos en <http://www.hptu.org.co/hptu/es/noticias/716-noticias-2013>

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser Hospital Universitario líder, referente, centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes, comprometido con la comunidad y trascendiendo al mundo.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

carlos.granda@datanetcolombia.com.co

De: Edison Andrés Vélez Ramirez <evelez@hptu.org.co>
Enviado el: martes, 15 de agosto de 2017 8:45 a. m.
Para: charly Rubio; nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Oscar Dario Saldarriaga
CC: andresm129@hotmail.com
Asunto: RE: Fwd: Inconvenientes control de Acceso torre A fin de semana

Buenos días

Milton, aclaro que esta novedad fue el domingo en la mañana, por lo tanto ustedes no se encontraban en el Hospital. De hecho yo no estaba de disponible y ayer en cuanto me fue informado lo notifique. Igual creo que en las reuniones que espero prontamente retomaremos podemos acordar cual sería el deber ser en estos casos (por lo menos mientras estabilizamos los sistemas), igualmente la entrega y el empoderamiento desde monitoreo nos aportara mucho con el manejo de las mismas.

Por la atención gracias

Cordialmente,



EDISON ANDRES VÉLEZ R.

Jefe Sección Ingeniería Hospitalaria
Departamento de ingeniería y mantenimiento

Email: evelez@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9950

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia

www.hptu.org.co

De: charly Rubio [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: lunes, 14 de agosto de 2017 06:57 p.m.
Para: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Oscar Dario Saldarriaga; Edison Andrés Vélez Ramirez
CC: andresm129@hotmail.com
Asunto: RE: Fwd: Inconvenientes control de Acceso torre A fin de semana

Buenas tardes Edison, no comprendo la referencia de su correo y mucho menos la hora en que se recibe, hemos estado realizando auditorías internas a los diferentes sistemas y ustedes han estado enterados así mismo Expertos y no comprendo porque no se me avisa a sabiendas que me encuentro en el HPTU y realizan operaciones sobre los equipos lo cual es muy preocupante.

Agradezco la atención prestada

Milton Marulanda


Buenas tardes

Nelson, he intentado comunicarme telefónicamente pero no he logrado ubicarlo, por lo tanto le informo que este fin de semana tuvimos problemas con el sistema de control de acceso en Torre A (Nuevamente se quedó bloqueado y todas las puertas cerradas). Por lo anterior nos vimos en la necesidad de desconectar eléctricamente todos los paneles/controladoras de los pisos ya que debíamos liberar puertas de áreas técnicas, cuartos de medicamentos, cuartos de equipos etc. En este momento el sistema se dejó de dicha manera.

Le agradezco la revisión del mismo, igualmente les informo para que estén al tanto de la novedad.

Por la colaboración gracias

Cordialmente,



EDISON ANDRES VÉLEZ R.

Jefe Sección Ingeniería Hospitalaria

Departamento de ingeniería y mantenimiento

Email: evelez@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9950

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia

www.hptu.org.co

Datanet Colombia
Calle 34AA No 80A-29 Medellín, Colombia.
PBX +57(4) 411 45 45 Fax +57(4) 581 20 12
datanet@datanetcolombia.com.co
www.datanetcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

carlos.granda@datanetcolombia.com.co

De: Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: martes, 23 de mayo de 2017 7:19 a. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'
CC: 'Nelson Vargas'
Asunto: RE: solicitud acompañamiento tendido cableado camaras ascensores HPTU

Buenos días Don Oscar, no se ha realizado, necesitamos el acompañamiento para los ascensores de urgencias, plantas bajas y además iniciar pruebas con las cámaras.

Milton Marulanda

De: Oscar Dario Saldarriaga [mailto:Osaldarriaga@hptu.org.co]
Enviado el: martes, 23 de mayo de 2017 7:02
Para: Milton Marulanda
CC: Nelson Vargas
Asunto: RV: solicitud acompañamiento tendido cableado camaras ascensores HPTU

Buenos días, Milton este acompañamiento y trabajo para cableado estas cámaras si se realizo??

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Oscar Dario Saldarriaga
Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2017 07:00 a.m.
Para: 'Oscar Botero - ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A'; gsierra@ieinterventoria.com
CC: 'Maldonado1, Jhon'; Milton Marulanda
Asunto: RV: solicitud acompañamiento tendido cableado camaras ascensores HPTU

Buenos días, se requiere programar el acompañamiento de OTIS para la instalación de cableado de cámaras en ascensores

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Milton Marulanda [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: martes, 16 de mayo de 2017 07:50 p.m.
Para: juan.gonzalez2@otis.com; Oscar Dario Saldarriaga
Asunto: solicitud acompañamiento tendido cableado camaras ascensores HPTU

Buenas noches Don Juan la presente es con el fin de solicitar comedidamente el acompañamiento por parte de ustedes para el cableado de las cámaras ascensores de lobby, urgencias, administrativo.

Quedo atento a sus indicaciones, le agradezco la atención prestada, feliz noche.

Milton Marulanda



Libre de virus. www.avast.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

Visite nuestro portal web www.hptu.org.co

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra política de manejo de datos en <http://www.hptu.org.co/hptu/es/noticias/716-noticias-2013>

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser Hospital Universitario líder, referente, centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes, comprometido con la comunidad y trascendiendo al mundo.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

carlos.granda@datanetcolombia.com.co

De: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2017 4:39 p. m.
Para: charly Rubio; 'Nelson Vargas'
CC: carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Wilfer Andres Zuluaga Alzate
Asunto: RE: Tarjeta lectora bloqueada y alarmada

Importancia: Alta

Buenas tardes Milton , el numero de la OT es : 2017-34987

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: charly Rubio [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2017 03:43 p.m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga; 'Nelson Vargas'
CC: carlos.granda@datanetcolombia.com.co
Asunto: RE: Tarjeta lectora bloqueada y alarmada

Buenas tardes Don Oscar, por favor nos envía el número de la OT para enviar el personal a revisar dicha lectora.

Agradeciendo la atención prestada,

Milton Marulanda

De: Oscar Dario Saldarriaga [mailto:Osaldarriaga@hptu.org.co]
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2017 3:12 p. m.
Para: 'Nelson Vargas' <nelson.vargas@datanetcolombia.com.co>; Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
CC: carlos.granda@datanetcolombia.com.co
Asunto: RV: Tarjeta lectora bloqueada y alarmada
Importancia: Alta

Buenas tardes, Nelson envió solicitud para revisar esta tarjeta, esta alarmada
Gracias

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Oscar Dario Saldarriaga
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2017 06:54 a.m.
Para: 'Nelson Vargas'; 'Milton Marulanda'
CC: Wilfer Andres Zuluaga Alzate
Asunto: RV: Tarjeta lectora bloqueada y alarmada
Importancia: Alta

Buenos días , Nelson envió solicitud para revisar esta tarjeta de torre A, pisos 2 urgencias, entrada a sala de evidencias. Por favor revisar.

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Wilfer Andres Zuluaga Alzate
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2017 03:12 p.m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga
CC: Edison Andrés Vélez Ramirez
Asunto: Tarjeta lectora bloqueada y alarmada

Buenas tardes don Oscar.

En el almacén de evidencias piso dos torre a eje 13 la tarjeta lectora está alarmada y bloqueada generando molestias pues el pitode la misma entorpece los colaboradores de urgencias.

Quedo atento a su colaboración, gracias.



Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial

del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

carlos.granda@datanetcolombia.com.co

De: charly Rubio <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: viernes, 16 de junio de 2017 6:12 p. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'
Asunto: Infraestructura piso 8 valvulas verticales

Buenas noches Don Oscar, hoy se pudo tras varios intentos abrier la puerta del cuarto eléctrico piso 8 eje 16 y observamos que hace falta infraestructura para los modulo monitor de las válvulas verticales de dicho eje.

Agradezco la atención prestada, feliz noche.

Milton Marulanda
Datanet Colombia
Calle 34AA No 80A-29 Medellín, Colombia.
PBX +57(4) 411 45 45 Fax +57(4) 581 20 12
datanet@datanetcolombia.com.co
www.datanetcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"



Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de [avast! Antivirus](#) está activa.

Guillermo Orrego

De: carlos.granda@datanetcolombia.com.co
Enviado el: miércoles, 26 de julio de 2017 4:02 p. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'
CC: 'Elizabeth Toro Londoño'; 'CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA'; andresm129@hotmail.com; oscarbotero@arquitecturayconcreto.com
Asunto: DATANET COLOMBIA: ENTREGA DE SUMINISTROS CABLEADO ESTRUCTURADO CE027 NUEVO INCUMPLIMIENTO DEL HPTU.

Reciban un cordial saludo,

Nuestra organización ve con preocupación un nuevo incumplimiento de parte de HPTU, sumado ya a los cambios de versiones ocurridos en múltiples reuniones, se tenía un pacto de entrega para el día de hoy a las 3pm para entregar en suministro los elementos del citado contrato tanto con interventoría como con obra, el mismo fue cancelado y no avisado, le toco a nuestro personal comenzar a indagar donde debíamos entregar los suministros, la interventoría contesto que no los recibirían, ni siquiera mediante un medio oficial dieron ustedes una respuesta.

Nosotros teníamos listo transportista y entrega de bodega externa donde tenemos sus equipos y elementos y toco cancelar al transportista y toca pagar otros meses de arriendo de la citada bodega, quiero decirles a ustedes que es hora que nos informen que pasa con este tema, ya que en meses anteriores cuando la administración delegada estaba se le pregunto y dieron respuesta que el HPTU no había destinado una bodega para esto, quiero también manifestarles a ustedes que los equipos y elementos que tenemos en bodega son de ustedes y no los importamos porque a nosotros nos pareció, los importamos porque están sustentados en contratos y en otro si que nosotros no diseñamos y que ustedes dieron la orden al administrador delegado para realizarlos.

Esperamos que nos informen donde y cuando entregar estos elementos y vuelvo y reitero que estamos absorbiendo costos indirectos que nos están afectando como organización.

Atentamente.

Carlos Granda.
Datanet Colombia SAS.

Guillermo Orrego

De: VALERIA GRANDA <valeria.granda@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2017 8:46 a. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'
CC: carlos granda; nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; Sara Jaramillo; Hayward Charly Rubio
Asunto: ENTREGA DE EQUIPOS HPTU
Importancia: Alta

Buenos días Doctor Oscar

Espero se encuentre muy bien. La entrega del suministro de automatización y cableado estructurado se realizara el día de mañana en las horas de la mañana al ingeniero Milton y el la realizara en la tarde al Hospital como habíamos acordado la semana pasada en reunión.

Quedo atenta , feliz día

Cordialmente

Valeria Granda Guzmán

Jefe de compras nacionales e internacionales y bodegaje

PBX: (574) 411 45 45

"EN DATANET HACEMOS LAS COSAS BIEN, PORQUE...QUEREMOS LO QUE HACEMOS"



De: Nelson Vargas <nelson.vargas@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2017 12:01 p. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'; 'evelez@hptu.org.co'
CC: 'carlos.granda@datanetcolombia.com.co'; Milton Marulanda; andresm129@hotmail.com
Asunto: RE: Tabla actualizada de automatización torre A
Datos adjuntos: Automatización-Datanet 13 Dic 2018rev.xlsx

Seguimiento:	Destinatario	Lectura
	'Oscar Dario Saldarriaga'	
	'evelez@hptu.org.co'	
	'carlos.granda@datanetcolombia.com.co'	Leído: 18/12/2017 12:37 p. m.
	Milton Marulanda	Leído: 19/12/2017 8:29 a. m.
	andresm129@hotmail.com	

Cordial saludo,

Don Oscar le envió la tabla de liquidación del contrato de automatización de torre A con la aclaración a las observaciones enviadas por Edison. En esta tabla se realizó la corrección de unos errores identificados. De acuerdo a esta tabla el saldo pendiente por suministro es de **USD 57.520,93**. Se requiere que el HPTU revise esta cifra para proceder con la facturación del porcentaje correspondiente al sistema de CCTV (28.09%). Por favor notificarnos sobre cualquier duda presentada.

Por otro lado, es importante solicitar al departamento de tesorería del HPTU el estado actual de amortización del anticipo de este contrato, con el fin de tener claro cuánto de este anticipo aún falta por amortizar.

Atentamente,



NELSON JULIÁN VARGAS E.
TECHNICAL SUPPORT
DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.
CARRERA 82A # 32EE-69 MEDELLÍN - COLOMBIA
E-mail: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co
nelsonjvargas@gmail.com
TELÉFONO: (574) 3224631
CELULAR: (57) 3176574230

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial de DATANET COLOMBIA. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

DATANET COLOMBIA.

De: Oscar Dario Saldarriaga [mailto:Osaldarriaga@hptu.org.co]

Enviado el: viernes, 15 de diciembre de 2017 06:52 a.m.

Para: 'Nelson Vargas'

Asunto: RV: Tabla actualizada de automatización torre A

Buenos días Nelson , con el fin de tener todo ya claro y revisado, hay algunas dudas que plantea Edison , el lunes nos podemos reunir para verlas y dejar estos cuadros también listos, mientras se hace entregas físicas.

Gracias

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: Edison Andrés Vélez Ramirez

Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2017 03:31 p.m.

Para: Oscar Dario Saldarriaga

Asunto: RV: Tabla actualizada de automatización torre A

Buenas tardes

Don Oscar, adjunto las observaciones respecto al corte final que envía Datanet por suministro con un valor de USD 63,497. Igualmente es importante la aclaración respecto al corte final para efectos de instalación, es el que se indica Datanet como corte de instalación No 17 por 131M?

Igualmente quedo atento en caso de ser necesario reunión con Datanet para validar cada punto

Por la aclaración gracias

Cordialmente,



EDISON ANDRES VÉLEZ R.

Jefe Sección Ingeniería Hospitalaria

Departamento de ingeniería y mantenimiento

Email: evelez@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9950

De: Nelson Vargas [mailto:nelson.vargas@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2017 12:03 p.m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga; Edison Andrés Vélez Ramirez
CC: carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Milton Marulanda; andresm129@hotmail.com
Asunto: Tabla actualizada de automatización torre A

Cordial saludo,

Por medio del presente envío tabla de liquidación (en formato suministrado por la obra) actualizada con el corte 18 por suministro y con las cantidades discutidas en la reunión del pasado día lunes 11 de diciembre en el HPTU. En esta tabla se especifica de forma clara el saldo restante por facturar para el suministro del contrato de automatización. Tal y como se trató en la reunión sostenida en el HPTU el día 11 de diciembre, se solicita al HPTU revisar esta tabla y enviar un correo con los ítems en los cuales se presenten dudas por parte del HPTU para que Datanet las pueda aclarar de forma oportuna. Se requiere que el HPTU agilice dicha revisión para poder proceder con la facturación el 28.09% del saldo faltante de liquidación correspondientes al sistema de CCTV. Datanet realiza la claridad que se procederá con las entregas del sistema de control de acceso tan pronto se haya finalizado el trámite completo con el sistema de CCTV.

Atentamente,



NELSON JULIÁN VARGAS E.
TECHNICAL SUPPORT
DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.
CARRERA 82A # 32EE-69 MEDELLÍN - COLOMBIA
E-mail: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co
nelsonjvargas@gmail.com
TELÉFONO: (574) 3224631
CELULAR: (57) 3176574230

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial de DATANET COLOMBIA. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

DATANET COLOMBIA.

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Guillermo Orrego

De: charly Rubio <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: miércoles, 12 de abril de 2017 2:43 p. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'
Asunto: Incendio y comunicaciones piso 1 locales

Buenas tardes Don Oscar, en recorrido el día de hoy con Esteban de HPTU, encontramos que ya se podía instalar bases y sensores en varios locales de piso 1, (esta actividad ya se realizó tras el recorrido), las actividades pendientes como son la estación manual completa y los sensores en los otros locales necesitan definición e infraestructura, Esteban ya quedó al tanto y nos informará cuando podemos terminar dichas actividades.

Respecto a la farmacia estamos a la espera de la finalización de la infraestructura de comunicaciones y respecto a incendio ya se realizó el cableado pero para instalar bases y sensores debemos esperar los acabados en dry Wall.

Agradeciendo la atención prestada, feliz día.

Milton Marulanda
Datanet Colombia
Calle 34AA No 80A-29 Medellín, Colombia.
PBX +57(4) 411 45 45 Fax +57(4) 581 20 12
datanet@datanetcolombia.com.co
www.datanetcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"















30-05-2017 10:31:44

02:45







	ACTA # 3		
	Código: GOP-07 V 01	Fecha de Vigencia: 2011- 05-11	Página 1 de 1

Fecha: 30/08/2017

Lugar: Medellín

Obra: Torre A

Se realiza entrega en suministro de los equipos que hicieron falta en la entrega final de material.

- 2 patch cord STP6C1M
- 1 cámara tipo bala bullet HICC2600TVI

A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS LA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA ES DEL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE (ENTIDAD CONTRATANTE).



30 AGO 2017

Valeria Grandu
DATANET COLOMBIA NETWORKS

RECIBIDO ALMACÉN
Felipe Trujillo
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

“En DATANET hacemos las cosas bien, porque... queremos lo que hacemos”

	ACTA # 4		
	Código: GOP-07	V	Fecha de Vigencia: 2011-05-11
01			Página 1 de 1

Fecha: 04/10/2017
Lugar: Medellín
Obra: TORRE A

Se realiza entrega en suministro de las 5.000 tarjetas MIFARE según contrato ce028 que no fueron instalados.

A partir de la entrega de las mismas, la responsabilidad es del Hospital Pablo Tobon Uribe (entidad contratante)


EL HOSPITAL CON ALMA
Pablo Tobón Uribe
04 OCT 2017
RECIBIDO ALMACÉN

Valeria Granda
VALERIA GRANDA GUZMAN

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

“En DATANET hacemos las cosas bien, porque... queremos lo que hacemos”

	ACTA # 1		
	Código: GOP-07	V	Fecha de Vigencia: 2011-05-11
	01		Página 1 de 2

Fecha: 28/08/2017

Lugar: Medellín

Obra: Torre A

Se realiza entrega en suministro de los equipos de cableado estructurado según contrato ce027 que no fueron instalados por obra.

CONTRATO DE CABLEADO ESTRUCTURADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT A ENTREGAR
✓ 1	Conector LC Fibra Multimodo	UND	256,00
✓ 2	Patch cord 3 feet categoría 5e	UND	232,00
✓ 3	Salidas sencillas	UND	187,00
✓ 4	JACK 6A BLINDADO PARA FACE PLATE	UND	484,00
✓ 5	Patch Cords de dos hilos para fibra óptica, 3 m, conectores LC. Ensamblados en fábrica.	UND	91,00
* 6	Patch Cord F/UTP Cat 6A, 1 metro. Ensamblados en fábrica <i>2 unidades</i>	UND	354,00 / <i>352</i>
✓ 7	Patch Cord F/UTP Cat 6A, 1.5 metros. Ensamblados en fábrica	UND	1.029,00
✓ * 8	Patch Cord F/UTP Cat 6A, 3.0 metros. Ensamblados en fábrica <i>Faltan 3 cables</i>	UND	593,00 / <i>593</i>
✓ 9	Bandeja de Fibra Óptica deslizable de 24 puertos, incluye panel deslizable, herraje	UND	12,00
✓ 10	Panel acoplador de FO de 4 puertos	UND	72,00

“En DATANET hacemos las cosas bien, porque... queremos lo que hacemos”

	ACTA # 1		
	Código: GOP-07 V	Fecha de Vigencia: 2011-05-11	Página 2 de 2

✓ 12	Barra de puesta a tierra de telecomunicaciones (TGB) con sus respectivos soportes y aisladores, certificada por UL y de acuerdo al estándar EIA/TIA-607-A	UND	8,00
✓ 13	Barra de tierra vertical para rack o gabinete de 19 pulgadas listada UL.	UND	8,00
✓ 14	Cable de conexión a tierra para aterrizaje de gabinete al sistema de tierra de telecomunicaciones listado UL <i>6096UH</i>	UND	11,00
✓ 15	Cable de conexión a tierra para aterrizaje de equipo activo al sistema de tierra de telecomunicaciones listada UL	UND	8,00

A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS LA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA ES DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE (ENTIDAD CONTRATANTE).

Valecia Ganda Gudián
DATANET COLOMBIA NETWORKS

Gloria Sierra C.
 JE HPTU, POI
 28/08/2017

ESTEBAN ALIATE SUYA

Wilmar A. Salvaggio A.

Felipe Trujillo N.
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE

Nota: Pend: 2 unidades
 EL HOSPITAL CON ALMA Pablo Tobón Uribe
Item: 6

28 AGO 2017

RECIBIDO ALMACÉN

“En DATANET hacemos las cosas bien, porque... queremos lo que hacemos”

Fecha: 28/08/2017

Lugar: Medellin

Obra: Torre A

Se realiza entrega en suministro de los equipos de AUTOMATIZACION según contrato ce028 que no fueron instalados por obra.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT A ENTREGAR
1	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO		
1.1	✓ Detector de humo/calor tipo fototérmico direccionable	Un	11,00 ✓
1.2	✓ Detector de calor por temperatura fija y rata de incremento (direccionable)	Un	23,00 ✓
1.3	Base normalizada para detectores	Un	70,00 ✓
1.4	✓ Estación manual de alarma completa (pull station) direccionable	Un	18,00 ✓
1.5	✓ Alarma audiovisual (horn & strobe)	Un	12,00 ✓
1.6	Módulo de control	Un	32,00 ✓
1.7	Módulo Monitor	Un	22,00 ✓
1.8	Detector de Humo en Ducto	Un	23,00 ✓
1.9	Detector de gas	Un	2,00 ✓
1.10	Tarjeta expansora de lazo 5015 x1	Un	1,00 ✓
2	SISTEMA DE SEGURIDAD		
2.1	Control de accesos		
2.2	Fuente de potencia a 12VDC 2.5 amperios	Un	63,00 ✓

2.3	Supresor de corriente	Un	230,00	✓
2.4	Controlador de accesos IP	Un	7,00	✓
2.5	Módulo para 2 lectoras de proximidad	Un	5,00	✓
2.6	Módulo para 16 entradas digitales	Un	6,00	✓
2.7	Gabinete para control de accesos	Un	6,00	✓
2.8	Cable de conexión para controlador de accesos	Un	7,00	✓
2.9	Fuente de potencia para control de accesos <i>2ERS</i>	Un	7,00	✓
2.10	Baterías de respaldo	Un	7,00	✓
3	Circuito Cerrado de Televisión CCTV			
3.1 <i>HAPBF</i>	Cámara fija tipo domo IP	Un	12,00	✓
3.2	Cámara móvil tipo domo IP	Un	4,00	✓
<i>13.3</i>	Cámara fija Ascensores lente gran angular	Un	17,00	✓
3.4	<i>*</i> Cámara fija IP	Un	18,00 / <i>17</i>	✓
<i>3.5</i>	Adpatador 12VDC para fuentes fijas ascensores	Un	17,00	✓
<i>3.6</i>	Transceptor de video (video balun) para cámaras fijas ascensores	un	30,00	✓
<i>3.7</i>	Encoder de video de 1 canal	un	17,00	✓
<i>3.8</i>	Housing para cámara móvil IP	un	4,00	✓
<i>3.9</i>	Fuente de potencia para cámara móvil IP	un	7,00	✓
4	Alarmas			
<i>4.1</i>	Botón de pánico inalámbrico	Un	10,00	✓
<i>4.2</i>	Receptor inalámbrico	Un	1,00	✓
<i>4.3</i>	Repetidor inalámbrico	Un	1,00	✓
5	SISTEMA EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS			
<i>5.1</i>	Módulos de 16 entradas analógicas	Un	✓6,00	- 1600
5.2	Módulos de 16 salidas analógicas	Un	✓6,00	- 1198
<i>5.3</i>	Módulos de 32 entradas digitales	Un	✓16,00	- 1600
5.4	Módulos de 32 salidas digitales	Un	✓6,00	- 16160
6	Sistema equipos Electromecánicos			
<i>6.1</i>	Módulos de 16 entradas analógicas	Un	✓2,00	- 1600
<i>6.2</i>	Módulos de 16 salidas analógicas	Un	✓4,00	- 1198
6.3	Módulos de 32 entradas digitales	Un	✓8,00	- 1600
6.4	Módulos de 32 salidas digitales	Un	✓4,00	- 16160

2

A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS, LA RESPONSABILIDAD ES DEL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE (ENTIDAD CONTRATANTE)

3

debe 1 camara
Bata

se Daniel A. Quintero Rincón
Wilfer A. Zuluaga

liberia grande
DATANET COLOMBIA NETWORKS

Gloria Sierra E
DE HPTU ROS
28/08/2017.

ESTEBAN ALIATE JIWA

Felipe Tobón A.
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE

Nota: Pendiente 7 unidades
item. 3.4

EL HOSPITAL CON ALMA
Pablo Tobón Uribe

28 AGO 2017

RECIBIDO ALMACÉN

3



Medellín Junio 12 de 2017



Hospital Pablo Tobón Uribe
Centro de Documentos

No Radicado	C-2017-00029955
Fecha y Hora	2017-06-12 14:36

Señores:

Hospital Pablo Tobón Uribe.

Doctora Elizabeth Toro.

Gerente Proyecto Institucional TORRE A.

Copia. Dr. Oscar Dario Saldarriaga.

Gerente Técnico TORRE A.

La Ciudad.

ASUNTO: Solicitud de Prórroga Contrato Automatización Contrato CE028.

Cordial Saludo,

Doctora Elizabeth Toro mediante el presente me dirijo ante usted con el fin de solicitar de la manera más cordial una ampliación en tiempo de 1.5 meses, es decir hasta Julio 28 para la terminación del citado contrato, si se analiza en este tiempo hay cerca de 4 festivos no dominicales que alteran el tiempo de entrega y sustentado en la siguiente información que detallaremos:

1. Ajuste de lo que se tiene actualmente en electromecánicos: Sistemas de Tanques: Agua potable, agua gris, agua tratado y agua caliente.
2. Comisionamiento de BMS:
 - 2.1 Configuración de usuarios operadores: para esto se necesita la apertura de los puertos en los PC's y servidores ubicados en el edificio técnico y DATACENTER para operación de los sistemas acceso, video y BMS.

Calle 34 AA # 80 * 29 PBX: 4114545 Fax: 4139564 email: carlos_granda@datanetcolombia.com.co



www.datanetcolombia.com.co

Medellin - Colombia

- 2.2 Pruebas en campo en conjunto con personal del HPTU: de equipos electromecánicos mencionados anteriormente y subsistemas verticales actuales en la torre A como: acceso, Intrusión, Incendio y Video.
- 2.3 Pruebas de notificación y eventos en campo en el BMS.
3. Pendiente tendido de infraestructura (esto es pendiente de obra) en el sistema de incendio que comunica a parqueaderos con el eje 6 piso 2 TORRE A.
4. Pendiente de instalación de tomas 110V para las cámaras móviles (esto es pendiente de obra) en total son 11 cámaras.
5. Infraestructura para tendido de cable de datos para 2 cámaras en sendero y una móvil en fachada.
6. Registro para cámaras: 2 cámaras en piso 2 puntos fijos parqueadero salida hacia el sendero (esto es pendiente de obra), desmonte y apertura de orificios módulos de madera para 10 cámaras.

Basado en lo expuesto anteriormente sugerimos de forma respetuosa de que en caso de aprobar la ampliación de prórroga, la misma se amplíe en un porcentaje con respecto al proyecto para la emisión de la póliza, ya que lo que falta es prácticamente el Comisionamiento de BMS y temas puntuales de registros de cámaras, adicionalmente la parte de electromecánicos (BMS) representa el 9% del valor global del contrato.

Nuestra organización tiene una propuesta para someterla al análisis de su grupo y está basada en el número de años que tenemos trabajando con ustedes y con el ánimo de que la inversión realizada por la institución que usted representa, se soporte en hechos tangibles, para esto tenemos la siguiente propuesta:

Calle 34 AA # 80 * 29 PBX: 4114545 Fax: 4139564 email: carlos.granda@datanetcolombia.com.co



www.datanetcolombia.com.co

Medellin - Colombia

1. BASE DE LA PROPUESTA:

Nuestra organización cuenta actualmente con el mantenimiento de los sistemas de acceso e incendio de la Torre B, proponemos a ustedes sea renovado el contrato vigente por un año más de los mencionados sistemas y dentro de este periodo nuestra organización realizara la mano de obra e ingeniería sin ningún costo adicional de los siguientes verticales pendientes en la TORRE A:

- 1.1 Sistema de electromecánicos por variables físicas (controladores de campo).
- 1.2 Sistema de electromecánicos por variables de protocolo.

Cabe anotar que no tenemos entrega a la fecha de los mencionados subsistemas de la infraestructura para poder instalar y programar dichas variables dentro del BMS y que a partir de la entrega de la misma se requiere un número de semanas para programación y pruebas en campo descritas en el cronograma enviado por nuestra organización en el mes de febrero de 2017.

2. BENEFICIOS MUTUOS DE LA PROPUESTA:

- 2.1 HPTU podrá contar con todas las variables requeridas en el diseño de los pliegos a medida que se entregue la infraestructura.
- 2.2 HPTU Podrá contar con todo el BMS completo para las variables expuestas por el diseñador.
- 2.3 HPTU no tendrá un sobre costo por mano de obra e ingeniería, que son elementos costosos para cualquier implementación de integración de edificios.





2.4 DATANET se beneficia por que puede seguir contando dentro de su portafolio de clientes con el HPTU.

Queremos clarificar que la anterior propuesta se sustenta en el hecho de:

- Se liquide el contrato vigente de automatización CE028 al 28 de julio de 2017.
- Se realice un cronograma claro y detallado en caso de que se apruebe la anterior propuesta, con el fin de que se tengan metas claras y se pueda evaluar los compromisos y el servicio prestado.

Quedamos atentos a cualquier tipo de aclaración o duda.

Atentamente.

Carlos Granda.
Gerencia General.
Datanet Colombia SAS.

Calle 34 AA # 80 * 29 PBX: 4114545 Fax: 4139564 email: carlos.granda@datanetcolombia.com.co



www.datanetcolombia.com.co

Medellin - Colombia



Hospital Pablo Tobón Uribe

Centro de Documentos

No Radicado	C-2017-00033631
Fecha y Hora	2017-12-20 10:28

Medellín, 19 de diciembre de 2017

Ingeniero
Oscar Saldarriaga
HPTU

Buenas tardes Don Oscar, tras la misiva enviada por el Gerente de Datanet respecto a las vacaciones colectivas procedo a radicar informe del trabajo realizado en el sistema de CCTV en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

Las inconformidades atribuibles a Datanet encontradas tras la verificación por parte del HPTU y Datanet fueron solucionadas y el sistema se encuentra en óptimas condiciones de configuración y funcionamiento.

Debido a lo anterior y que retomaremos labores el día 11 de enero de 2018, cualquier evento que ocurra en este sistema durante este periodo no será responsabilidad nuestra.

Recomiendo que no se realice una manipulación indebida en las NVRs, cambio de passwords etc por personal ajeno a nuestra organización, como ha ocurrido en otras ocasiones y está debidamente documentado.

Agradezco toda la atención prestada, le deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo.

Milton Marulanda
Milton Marulanda
Residente de Obra

No Radicado	C-2017-00033632
Fecha y Hora	2017-12-20 10:29

	REVISION DE PROYECTOS		
	Código: FOP-17 V01	Fecha de vigencia: 2015-04-13	Página: 1 de 2

FECHA: 18/12/2017

Reporta: Milton Marulanda

CLIENTE: Hospital Pablo Tobón Uribe

No. OT/Ticket:

PROYECTO: Correctivos sistema CCTV

ENCARGADO INSTALACION: Sebastian Revuelta

UBICACION: Hospital Pablo Tobón Uribe

ALCANCE: Entrega sistema CCTV Hospital Pablo Tobón Uribe

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA: Tras la verificación del funcionamiento del sistema de CCTV se encontraron algunas inconformidades, las cuales fueron corregidas en el tiempo estipulado.

CALIDAD DE LA INSTALACION: Se realiza reconfiguración de cámaras que se podían observar a través de un web browser, de manera tal que ya se observan desde el centro de monitoreo.

AVANCE DE ENTREGAS:**14 DE DICIEMBRE 2017**

Se realiza el traslado de cámaras que se visualizaban a través de web browser de una NVR a otra donde quedaran grabando para la entrega de las mismas:

Se organizan 26 camaras de la siguiente manera:

4 en la nvr 8:181, 182,189,190

6 en la nvr 6:203,295,251,267,262,272

3 en la nvr 1:305,306,286

8 en la nvr 11:223,224,226,227,228,229,230,232

5 en la nvr 12:231,235,236,307,325

Se refresca el Max Pro y se quitan las cámaras que aparecían en dos NVR:

1,4,5,7,14,15,16,17,19,20,21,24,302

Todas quedan observándose perfectamente a través de monitoreo.

15 DE DICIEMBRE 2017

Se realiza el traslado de cámaras que se visualizaban a través de web browser de una NVR a otra donde quedaran grabando para la entrega de las mismas:

Se organizan 26 camaras de la siguiente manera:

1 en la nvr 6:38

5 en la nvr 12:318,303,141,328,195

6 en la nvr 13:225,234,

1 en la nvr 10:299

1 en la nvr 2:48

3 en la nvr 5:320,238,251

7 en la nvr 9:197,198,199,200,201,202,329

1 en la nvr 1:310

1 en la nvr 8:298

Todas quedan visualizando perfectamente a través de monitoreo.

CALIDAD DE LA INSTALACION: El sistema CCTV instalado y configurado se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento.

Las NVR han estado trabajando en un ambiente bastante polvoriento se recomienda su limpieza.

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Cámara tipo domo sulfatada que sufrió daño por agua en área snacks piso 8.**




- **NVR 4 con el disco duro extraído, el seguro violentado y mucho polvo.**







- Camaras 264, 275 presenta problemas de switch y vlan

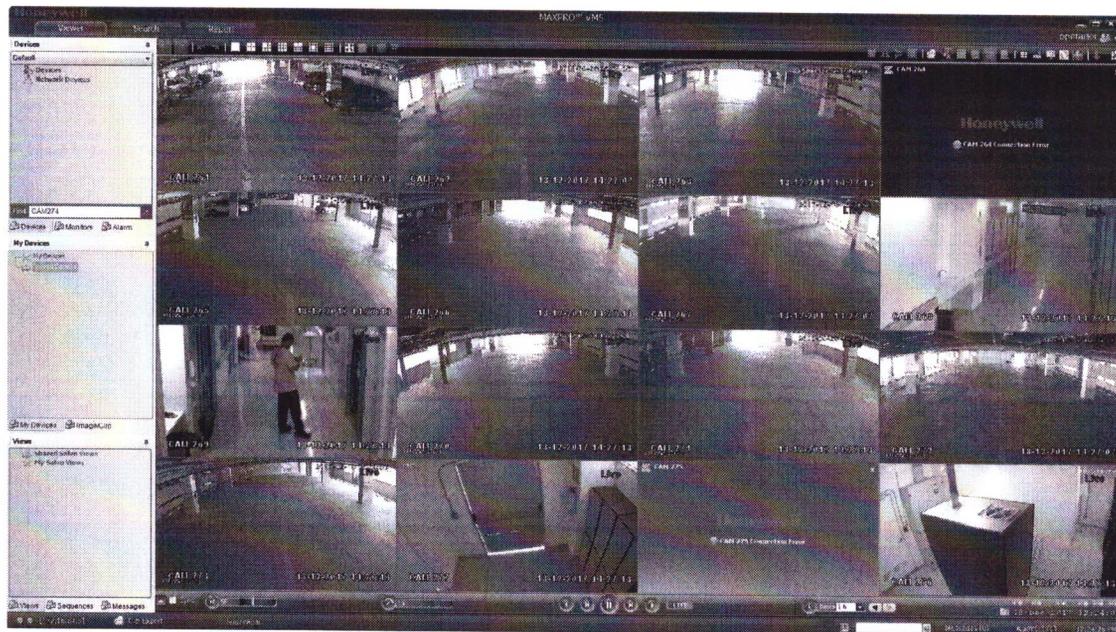


- **Todas las NVR presentan contaminación a través de polvo**

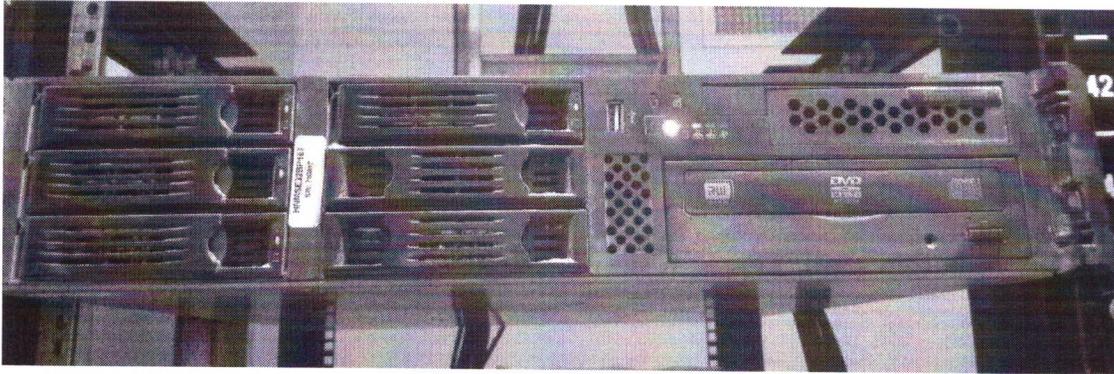


- **NVR RACK A**

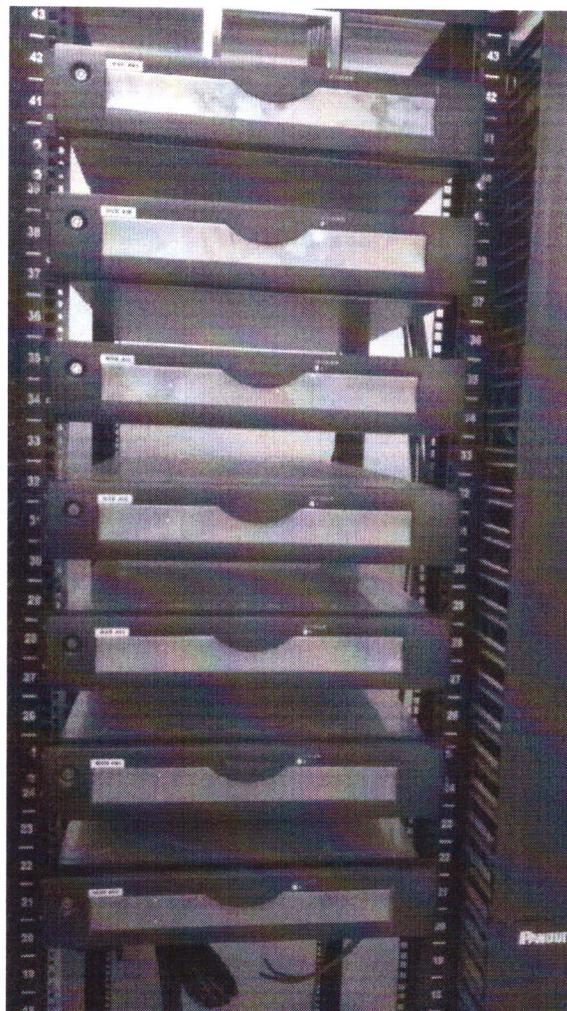

- **NVR Rack B**

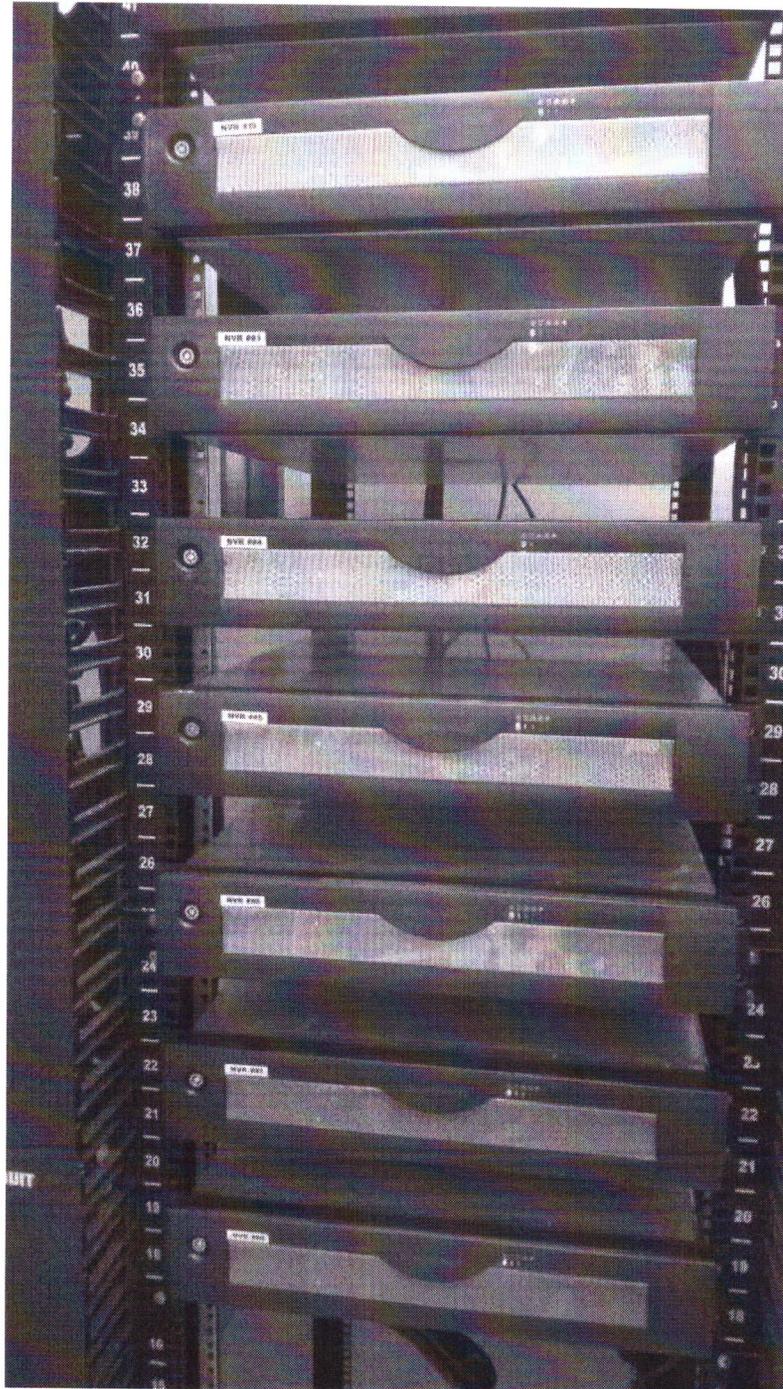

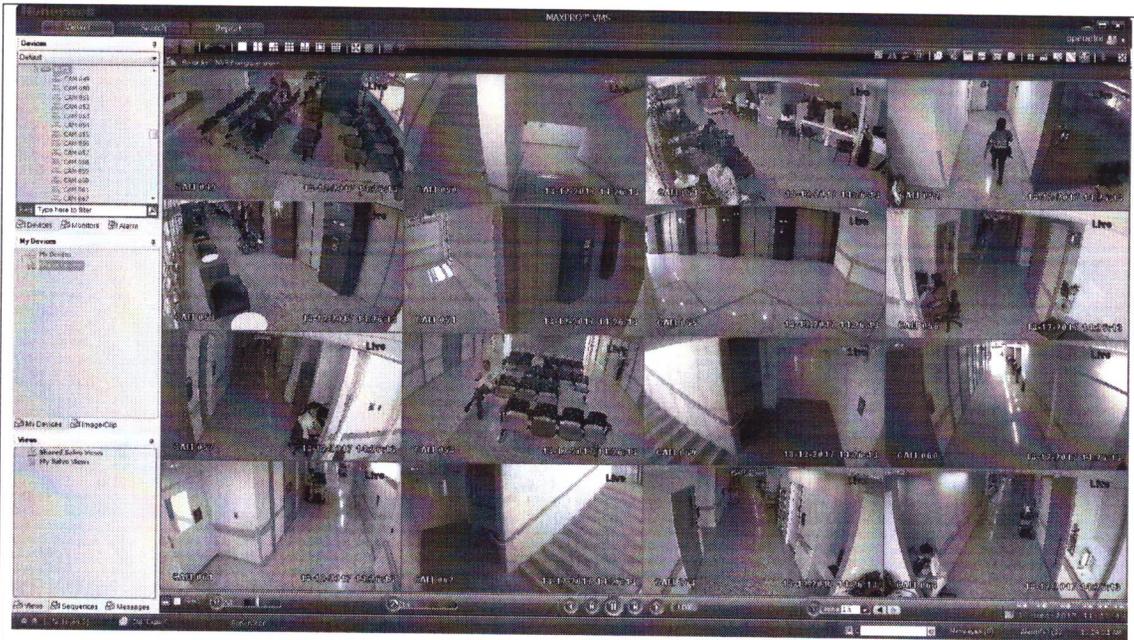

 Soluciones Integrales. Telecomunicaciones Automatización y Seguridad	REVISION DE PROYECTOS		
	Código: FOP-17 V01	Fecha de vigencia: 2015-04-13	Página: 8 de 2

PENDIENTES:

- Por parte de Datanet ninguno, el sistema de CCTV queda en condiciones optimas de funcionamiento y configuración a la espera de la recepción por parte del HPTU.

APTO PARA LA ENTREGA AL CLIENTE: SI NO

Especifique en cada caso: Se verificaron y se organizaron todas las "no conformidades" solicitadas por el HPTU

De: Milton Marulanda [dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: lunes, 06 de febrero de 2017 20:57
Para: 'HPTU Oscar Saldarriaga'
CC: 'HPTU - OSCAR BOTERO'
Asunto: recorrido puntos automatizacion

Buenas noches Don Oscar, el recorrido realizado con Julian Zapata no fue claro, aun no es solida la información respecto a la automatización y asi mismo no hay congruencia respecto a infraestructura, le ruego comedidamente un recorrido con el director de obra y con interventoria para evitar reprocesos y tener claridad acerca de lo que se va a instalar.

Agradezco la atención prestada, feliz noche

Milton Marulanda

De: Milton Marulanda [dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: jueves, 02 de febrero de 2017 5:55
Para: 'HPTU - OSCAR BOTERO'
CC: 'Oscar García - ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S'
Asunto: cableado multipar ascensores

Buenos dias don Oscar, ya se tendieron los cables multipar de los ascensores sucios, los ascensores externos y los ascensores internos,asi mismo la pequeña troncal que uniria a edificio técnico con planta baja 1, le ruego comedidamente me colabore con dos situaciones, la primera falta infraestructura para llegar a los cuartos de maquinas ubicados en piso 15 y segundo para poder ingresar a los controles de los ascensores que no tienen cuarto de maquinas necesitamos el acompañamiento y las llaves de los señores de Otis, en este momento lo que mas nos retrasa es el ultimo punto.

Agradezco toda su colaboración y atención brindada,

Milton Marulanda

RV: RADICADO 2019 - 00381

Juzgado 10 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto10me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 06/08/2020 17:19

Para: Carolina Garcia <cgarcia@cendoj.ramajudicial.gov.co>; juzgado10 Clvil Circuito Medellin <juzgadocivilcirto@gmail.com> 41 archivos adjuntos (24 MB)

recorrido puntos automatizacion.htm; HPTU resp LLAMADO EN GARANTIA.pdf; MUNDIAL respuesta llamado.pdf; pendientes infraestructura.msg.pdf; NOABANDONO.Acta seguimiento del BMS 2017-15.pdf; Re Tablas Inventario suministros y adicionales control acceso.msg.pdf; RADICADO SOLICITUD DE PRORROGA HPTU.pdf; Verificación CCTV.msg.pdf; SOPORTE ENTREGA DOCUMENTACION CCTV HPTU.pdf; Reporte revision control acceso.pdf; 2017-08-26 RE ENTREGA DE EQUIPOS HPTU (805 KB).msg.pdf; 2017-08-30 RE ENTREGA DE EQUIPOS HPTU (814 KB).msg.pdf; 2017-11-24 Corte Acta 18 suministro automatización torre A.msg.pdf; 2017-11-7 RV reunion con Datanet.msg.pdf; 2017-12-5 RV DATANET COLOMBIA Entrega de subsistemas y facturación contrato CE028 Automatización Torre A..msg.pdf; ACTA OSCAR DARIO.pdf; 2017-12-5b Re DATANET COLOMBIA Entrega de subsistemas y facturación contrato CE0... (861 KB).msg.pdf; 2017-12-13 RV CCTV.msg.pdf; ACTA REUNION HONEYWELL.pdf; cableado multipar ascensores.htm; cableado multipar ascensores.pdf; CORREO 01.06.17.pdf; Correo 05.05.2017.msg.pdf; CORREO 14.09.2017 Auditoría.msg.pdf; CORREO 13.09.17.pdf; CORREO 18.05.2017 pendientes HPTU.msg.pdf; CORREO del 12.04.2017.msg.pdf; CORREO Recep.Sist. 16.08.2017.pdf; CORREO DEL .29.06.2017.pdf; CORREO. 14.08.2017.pdf; CORREO.carencia infraestructura 230517.pdf; COMUNICADO INCUMPLIMIENTO PACTOS HPTU.PDF; CORREO.OT.ACCESO.23.10.2017.pdf; CORREO16.06.17.pdf; DATANET COLOMBIA ENTREGA DE SUMINISTROS CABLEADO ESTRUCTURADO CE027 NUEVO INCUMPLIMIENTO DEL HPTU..msg.pdf; ENTREGA DE EQUIPOS HPTU.msg.pdf; CORREO.LIQUIDACIONCONTRATO13122018.pdf; Memorando.pdf; FOTOS Y VIDEOS.pdf; Actas de Entrega de Suministros HPTU.pdf; RADICADO HPTU AL DR. OSCAR SALDARRIAGA.pdf;

De: gorregop <gorregop@gmail.com>**Enviado:** jueves, 6 de agosto de 2020 4:47 p. m.**Para:** Juzgado 10 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto10me@cendoj.ramajudicial.gov.co>**Asunto:** RADICADO 2019 - 00381

Buenas tardes

Como apoderado de DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. adjunto al presente correo la respuesta a la demanda inicial dentro del llamamiento en garantía en el proceso de HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE contra MUNDIAL DE SEGUROS S.A., radicado # 05001310301020190038100.

Igualmente adjunto la prueba indicada en el acápite respectivo

He remitido copia de la misma al demandante conforme correo presentado con la demanda y copia al llamante en garantía.

--

GUILLERMO ORREGO PALACIO

Carrera 55 No. 40 A - 20 Of. 1010

Medellín, Colombia

Cel. No. 310 823 5011

Libre de virus. www.avast.com

RV: 2019-00381

Juzgado 10 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto10me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 10/08/2020 14:00

Para: Carolina Garcia <cgarcia@cendoj.ramajudicial.gov.co>; juzgado10 Clvil Circuito Medellin <juzgadocivilcirto@gmail.com>

De: gorregop <gorregop@gmail.com>**Enviado:** lunes, 10 de agosto de 2020 1:27 p. m.**Para:** Juzgado 10 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto10me@cendoj.ramajudicial.gov.co>**Asunto:** 2019-00381

Buenas tardes

El dia jueves envíe respuesta de llamamiento en garantía a este correo electrónico y no he recibido respuesta de recibido.

He recibido información en el día de hoy que los memoriales se deben enviar a un correo específico el cual los repartiría a cada despacho.

Sera posible me envíen por este medio, el correo donde se deben hacer llegar los memoriales? Y si el enviado el jueves anterior debo enviarlo de nuevo?

--

GUILLERMO ORREGO PALACIO

Carrera 55 No. 40 A - 20 Of. 1010

Medellín, Colombia

Cel. No. 310 823 5011
